




कोशी प्रदेश सरकार
खानेपानी, सिंचाइ तथा उर्जा मन्त्रालय
बिराटनगर, नेपाल



आ.ब. २०८२/०८३ को
चौथो त्रैमासिक तथा बार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी
मिति :- २०८३/०४/१२, १३ र १४

जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन, मोरङ

प्रस्तुतकर्ता
रणजीत कुमार झा
डिभिजन प्रमुख

डिभिजनको संगठन संरचना तथा पदपूर्तिको अवस्था

पद/ समुह/तह	कूल स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ती भएको स्थायी दरबन्दी	कूल रिक्त स्थायी दरबन्दी	करार
सि. डि. ई. (सिभिल/इरिगेशन)(नवौं/दशौं)	१	१		
इन्जिनियर (सिभिल/इरिगेशन)(सातौं/आठौं)	३	३		
लेखा अधिकृत (प्रशासन)(पाचौं/छैठौं)	१	१		
प्रशासन अधिकृत (प्रशासन)(पाचौं/छैठौं)	१	१		
सब इन्जिनियर /ईन्जिनियर छैठौं (पाचौं/छैठौं)	५	५		
कम्प्युटर अपरेटर (पाचौं/छैठौं)	१	१		
सि.ए.ओ.(छैठौं)	१	१	गत आ.व. देखि रिक्त	दैनिक ज्यालादारीमा कार्य संचालन
सवारी चालक	१	१		१
कार्यालय सहयोगी	२	१	१	१
जम्मा	१६	१५	१	२

वार्षिक प्रगति सारांश

सि.नं	कार्यक्रम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति (वार्षिकको आधारमा)	
		वार्षिक बजेट (रु.)	हाल सम्मको खर्च	वित्तिय %	भौतिक %
(क)	पुजीगँत (श्रोतगत)				
१	संघ तर्फ	१६५,७९३,०००	६४,०८२,२१८.००	३८.६५	४५
२	प्रदेश तर्फ	२०५,८५०,०००.००	१८१,८२९,५७२.८८	८८.३३	९०
	जम्मा	३७१,६४३,०००.००	२४५,९११,७९०.८८	६६.१६	७७
(ख)	चालु तर्फ	२२,७७७,०००.००	१८,४१९,२७८.९	८०.८७	९०
कुल जम्मा		३९४,४२०,०००.००	२६४,३३१,०६९.७८	६७.०२	७५

आ.व. २०८२-८३ को कार्यक्रमगत वार्षिक प्रगति विवरण

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम (ब.उ.शि.नं.)	योजना संख्या	कुल विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	योजना सम्पन्न संख्या	वित्तिय प्रगति %	भौतिक प्रगति %	कैफियत
१	३१३०२१०६४-प्रदेश जलस्रोत तथा सिंचाई विकास व्यवस्थापन कार्यक्रम	७३	१०२८००	६९	८५.४८	९४.५२	
२	३१३०२१०७४-प्रदेश जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यक्रम	९७	९७०५०	१००	९१.१४	९८.००	एक भन्दा बढी स्थानमा कार्य भएको
३	३१३९११२३४-नदी नियन्त्रण (संघ शसर्त अनुदान)	१	१००००	०	५०	७५	सम्पन्न हुन नसकेको
४	३०८०३१२२४-विपद प्रभावित जलस्रोत तथा सिंचाई पुनर्स्थापना आयोजना	१	१३,१६७	१	८०.८३	१००	योजना सम्पन्न
५	३०८०३१०५४-सिंचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजना	४	१,४२,६२६	०	३४	३५	१a२१b समेत

बहु वर्षीय योजनाहरुको विवरण र आ.व. २०८२-०८३ मा नया ठेक्का सम्झौता भएका समेत	
---	--

[illegible]

सि. न.	योजनाको नाम	सिंचित क्षेत्रफल (हे.)	कुल लागत रु.(०००)	योजनाको प्रकार (नया/पुनस्थापना)	आ.व. २०८१-०८२ मा भएको खर्च बजेट रु.(०००)	लाभान्वित जनसंख्या	आ.व. २०८२-०८३ मा विनियोजित खर्च बजेट रु.(०००)
--------	-------------	------------------------	-------------------	-------------------------------------	--	--------------------	---

आ.व. २०८१-०८२ मा स्रोत सुनिश्चित भएका योजनाहरू

१	Sita Dans Kerkha ISP	३७०	२०८२७६.४	Rehab	०	२१०१	४१६२०
२	Adarsha Paini ISP	२३०	७८५२५.९	Rehab	०	२२९५	८२३२०
३	Bhuwa Chisang IP	२२५	५७८००	Rehab	०	४०१२	८२४७
४	Sira Jimdari IP	३०९	८४५४२	Rehab	०	३९१३	८२४७
५	Letang Kamalpur Beldangi IP	१२०	६०६०८	Rehab	०	१०४५	१५०००
६	Maulibari Bakraha IP	२२७	७४८८३	Rehab	०	१३७०	१६०००
७	Latikhola Trishakti Badh IP	१५०	२११६६.७	Rehab	०	१२५०	१३१६७

आ.व. २०८२-०८३ मा IMEP कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजनाहरूको विवरण , १ (b) Batch

खर्च रु. हजारमा							
सि. न.	योजनाको नाम	सिंचित क्षेत्रफल (हे.)	कुल लागत रु.(०००)	ठेक्का सम्झौता रकम	आ.व. २०८१-०८२ सम्मको खर्च रु.	आ.व. २०८२-०८३ मा विनियोजित बजेट रु	चौथो त्रैमासिक समको खर्च रु.
१	S ita D a n s K e r k h a I S P	३७०	२०८२७६.४	१२३५७३.९	०	४१६२०	३२९३३.
२	A d a r s h a P a i n i I S P	२३०	७८५२५.९	३९४४५.२२४	०	८२३२०	१४९८५
३	S i r a j i m d a r i P a i n i I S P	३०९	८४५४२	०	०	८२४७	०
४	B h u w a C h i s a n g J a n t a B i k a s h I S P	२२५	५७८००	०	०	८२४७	०

आ.व. २०८२-०८३ मा ISIP कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजनाहरूको विवरण (ISIP कार्यक्रम संचालन भएका जिज्हा

						खर्च रु. हजारमा	
सि. न.	योजनाको नाम	सिंचित क्षेत्रफल (हे.)	कुल लागत रु.(०००)	ठेक्का सम्झौता रकम	आ.व. २०८१-०८२ सम्मको खर्च रु.	आ.व. २०८२-०८३ मा विनियोजित बजेट रु	चौथो त्रैमासिक समको खर्च रु.
१	Latikhola Trishakti	१५०	२११६६.७	९७८४.४८	०	१३१६७	१०६४३

DPR upto FY 2080-81

S.N	Name Of Project	Survey Fiscal Year	Total Cost (NRS.) As per DPR	Net Command Area In Hectare	Total House Hold	Population
1	Kishan Kulo Irrigation Sub project- Madhumalla Rural Municipality 3,5,6&8 Morang	2075-76	63689000.00	322	189	1191
2	Soonjhora jaya Chowk Paini Sub Project-Pathrisanischare Municipality 2, 3 Morang	2075-76	61764000.00	211	365	2609
3	Madaha Khola Borabandh Irrigation Sub Project, Sundar Haraicha Municipality -2 Morang	2075-76	33972000.00	185	205	1431
4	Rajghat Bakraha Mul Pani Irrigation Sub-Project, Urlabari Municipality -4 & 8	2075-76	38184000.00	235	249	1145
5	Letang Kamalpur Beldangi IP, Letang Municipality, Morang	2078-79	60608000.00	120	196	1045
6	Pathri Lati Khola Irrigation Project, Pathrisanischare Municipality , Morang	2078-79	74673900.00	250	227	1135
7	Titri Jhaak Paini Irrigation Project Pathrisanischare Municipality, Morang	2078-79	73393200.00	140	224	1230
8	Nunsari Mawa Thulopaini IP, Miklajung Rural Municipality 8 Morang	2078-79	77773000.00	200	580	2963
9	Maulibari Bakra Paini Irrigation Project Pathisanichare Municipality 5	2079-80	74883000.00	227	259	1370
10	Keshaliya Bandh Irrigation Project , Belbari Municipality-9 Morang	2079-80	61273600.00	200	325	1607
11	Beteni Bakra Paini Irrigation Project, Urlabari Municipality-1, Morang	2079-80	47365000.00	150	259	1370
12	Khayar Bhatti Bihibare Paini Irrigation Project-Urlabari Municipality-1,Morang	2079-80	64770300.00	200	259	1370
13	Bakhra Khola Hasandaha Irrigation Project-Pathrisanischare Municipality-5, Morang	2079-80	129314000.00	700	294	1176
14	Biran Koria Dangi Irrigation Project , Gramthan Rural Municipality 6,7 Morang	2080-81	92794000.00	250	420	2100
15	Jhaljhale Irrigation Project, Kanepokhari Rural Municipality -04 Morang	2080-81	97969000.00	550	560	2800
16	Dhaiti Khet Irrigation Project, Belbari Municipality 9 Morang	2080-81	195807820.54	566	3500	15000
17	Trisakti Bandh Irrigation Project, Pathrisanischare-Municipality 3, Morang	2080-81	52362000.00	150	300	1250
18	Bakhra Sector Irrigatin Project, Ratuwamai Municipality -09 Morang	2080-81	95112000.00	500	600	3000
19	Jan sewa Paini Irrigation Project, Pathrisanichare Municipality , Morang	2080-81	58086000.00	150	280	1400
20	Dans Khola River Training Works, , Pathrisaneschare Municipality , sunbarshi Municipality & Kanepokhari Rural Municipality Morang	2080-81	303902000.00	3000	2000	
20	Bakhra Solti Irrigation Project, Urlabari Municipality 02 Morang	2080-81	84789000.00	325	500	2500
22	Chisang River Training Work, Letang Municipality & Belbari Municipality	2080-81	414357317.26		15107	105744

आ.ब. २०८१-८२ मा विस्तृत अध्ययन भएका योजनाहरू

सि.न.	योजनाको नाम	सिंचित क्षेत्रफल(हे.)	कुल लागत (,०००)	योजनाको प्रकार(नयाँ/पुनर्स्थापना)	आ.ब. २०८२/८३ मा विनियोजित बजेट(,०००)	सम्भावित घरधुरी/जनसंख्या
१	मझुवा बाँध पैनी, बबियाबिर्ता	५६६	१९५,८०७.००	पुनर्स्थापना	५००	३५००/१५०००
२	जुडीखोला सि.यो., ग्राम्थान-६	२५८	३५,५५६.००	पुनर्स्थापना	५००	३६४/१३३०
३	राजघाट बक्राहा सि.यो.उर्लाबारी-४	५५०	१४५,५३६.००	पुनर्स्थापना	१०००	२२००/१००००
४	सार्वजनिक पैनी., केराबारी, ३/१०	१२६	४०,२६२.००	पुनर्स्थापना	१००००	५००/२२००
५	गैह्री ढुंगे सि.यो., मिक्लाजुंग-८	६५	२६,८५१.००	पुनर्स्थापना	१००००	६००/२४४५
६	शान्तिपथ सि.यो., पथरी शनिश्चरे-७	१००	३८,२९१.००	पुनर्स्थापना	१०००	१४८/९१६
७	भालुखोला सि. यो., केराबारी-२	४४	२१,५९८.००	पुनर्स्थापना/नयाँ	५००	६३/३४७

आ.व. २०८३/८४ मा स्वीकृत प्रदेश मझौला अन्तर्गतका योजनाहरु

लोहन्द्रा खोलामा तटबन्धन, जहदा- ७, मोरङ्ग (देवदयाल शाहको घर पश्चिम)	31154	संख्या	१	100
सिंघिया खोला तटबन्धन (पाथिभरा मार्ग स्थित हनुमान मन्दिरछेउ पश्चिमको किनारमा), विराटनगर- १, मोरङ्ग	31154	संख्या	२	100
लोहन्द्रा पुल दक्षिण लोहन्द्रा खोला तटबन्धन कार्य, बेलबारी न.पा.- २, मोरङ्ग	31154	संख्या	३	100
सिंघिया खोला तटबन्धन, विराटनगर- ७, मोरङ्ग	31154	संख्या	४	100

आ.व. २०८३/८४ मा स्वीकृत प्रदेश मझौला अन्तर्गतका योजनाहरू

१	31302108 प्रदेश मझौला सिँचाई कार्यक्रम	11.4.15.2231	लाटी खोला चिसोपानी सिँचाई योजना, पथरी शनिस्चरे-३, मोरङ्ग	सिंचित क्षेत्रफल विस्तार, कृषि उत्पादन वृद्धि	100.00
२		11.4.15.2554	विरान कोरिया डाँगी सिँचाई योजना, ग्रामथान गा.पा.६ मोरङ्ग	सिंचित क्षेत्रफल विस्तार, कृषि उत्पादन वृद्धि	100.00
३		11.4.15.4679	बक्राहा सोल्टी पैनी सिँचाई, उर्लाबारी ८ (साविक राजघाट ३, ४ र ५)	सिंचित क्षेत्रफल विस्तार, कृषि उत्पादन वृद्धि	100.00
४		11.4.15.4996	पथ्थरघट्टा सिँचाई योजना, सुन्दरहरैँचा- २, मोरङ्ग (मारियाबाँध)	सिंचित क्षेत्रफल विस्तार, कृषि उत्पादन वृद्धि	100.00
५		11.4.15.4995	श्री जनता बाँध सिँचाई योजना, रतुवामाई- ८, मोरङ्ग	सिंचित क्षेत्रफल विस्तार, कृषि उत्पादन वृद्धि	100.00
६		11.4.15.4994	सार्वजनिक पैनी सिं यो केरावारी- ७, मोरङ्ग	सिंचित क्षेत्रफल विस्तार, कृषि उत्पादन वृद्धि	100.00

बेरुजुको अवस्था

आ.ब.	बेरुजु रकम (रु हजारमा)	फर्छ्यौट भएको बेरुजुको रकम (रु हजारमा)	फर्छ्यौट हुन बाँकि बेरुजु (रु हजारमा)	कैफियत
०७५/०७६	१२३३.५५५	१२२८.२६२	५.२९३	आ.ब. २०८१/८२ मा केही नियमित भएको, सम्परीक्षण हुन बाँकि
०७६/०७७	२०४५२.९२८	१५८०७.९९९	४६४४.९२८	
०७७/०७८	११२०७.९०३	८९११.४२६	२२९६.४७७	
०७८/०७९	६८२२.८७३	६६८९.८८९	१३२.९८४	
०७९/०८०	३७१४.५५७		३७१४.५५७	
०८१/८२	१५१७.५२३		१५१७.५२३ (प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकोमा जवाफ पेश गरिएको)	
कुल जम्मा	४३४३१.८१६	३२६३७.५७६	१२३११.७६३	

संघियता लागु हुनु भन्दा अगाडिको बेरजु

प्रदेश नं. १ अन्तरगतका कार्यालयहरुको फर्स्यौट गर्न बाँकी बेरजु ।

सिचाइ विकास डिभिजन नं. १ मोरङ

सि.नं.	आ.व.	दफा	अनियमित/प्रमाण	असुल	पेशकी	जम्मा बेरजु	फर्क्यौट	बाँकी बेरजु	कैफियत
१	२०७२/७३	११	०	०	१४०००००	१४०००००	०	१४०००००	पेशकी बाँकी
२	२०७३/७४	१३	०	०	५००००००	५००००००	०	५००००००	मो. पेशकी फर्स्यौट हुन बाँकी
३	२०७४/७५	१०.१	५२९९६०	०	०	५२९९६०	०	५२९९६०	अग्रिम आयकर कट्टी नगरेको
४	२०७४/७५	१०.२	११७८४	०	०	११७८४	०	११७८४	अग्रिम आयकर कट्टी नगरेको
५	२०७४/७५	७.१	०	४२५०९५	०	४२५०९५	०	४२५०९५	दोहोरो भुक्तानी
६	२०७४/७५	८	०	०	७००००००	७००००००	०	७००००००	पेशकी बाँकी
७	२०७४/७५	९	१५५८८१६	०	०	१५५८८१६	०	१५५८८१६	मु.अ.कर समायोजन
जम्मा			२१००५६०	४२५०९५	१३४०००००	१५९२५६५५	०	१५९२५६५५	

जलउत्पन्न प्रकोप, मोरङ

सि.नं.	आ.व.	दफा	अनियमित/प्रमाण	असुल	पेशकी	जम्मा बेरजु	फर्क्यौट	बाँकी बेरजु	कैफियत
१	२०७०/७१	५	१९७२२९	०	०	१९७२२९	०	१९७२२९	मु.अ.कर समायोजन
२	२०७०/७१	६(५)	५०६०४७८	०	०	५०६०४७८	०	५०६०४७८	गैर सरकारी संस्थाबाट निर्माण कार्य
जम्मा			५२५७७०७	०	०	५२५७७०७	०	५२५७७०७	

आ.व.	बेरजु (रु.)	अवस्था
२०७२/७३	१,४००,०००	लागत कट्टाको लागि सिफारिस
२०७३/७४	५,०००,०००	लागत कट्टाको लागि सिफारिस
२०७४/७५	१०,१००,०००	लागत कट्टाको लागि सिफारिस
२०७४/७५	५२९,९६०.८१	२१,२५६.५६ कायम हुन् म.ले.प.लाई पत्राचार
२०७४/७५	११,७८४	दाखिलाको लागि समबन्धित लाई पत्राचार
२०७४/७५	४२५,०९५	पी.एस.रौतहा लाई पत्राचार



वार्षिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रदेश तर्फको मात्र

क्र स	कार्यक्रमगत	स्रोत	बिनियोजन (रु हजारमा)	खर्च (रु हजारमा)	वित्तीय प्रगति %	भौतिक प्रगति %	उपलब्धि विवरण सिंचाई हे. थप/पुनर्स्थापना		उपलब्धि विवरण न.नि. मिटर
			जम्मा (चालु+पुंजिगत)	जम्मा (चालु+पुंजिगत)			नयाँ	पुनर्स्थापना	
१	प्रदेश जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यक्रम (३१३०२१०७४)	प्र.स.	९४०००	८७२१०					
		प्र.स.	३०५००	१२४८					
		जम्मा	९७,०५०	८८४५९	९१.१५	९५			३३६१
२	प्रदेश जलश्रोत तथा सिंचाई विकास व्यवस्थापन कार्यक्रम (३१३०२१०६४)	प्र.स.	१०२१५०						
		प्र.स.	६५०						
		जम्मा	१०२८०	८७८७५	८५.४८	९२		२०६८	
३	जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयहरु (३१३०२१०१४)	प्र.स.	६०००						
		जम्मा	६०००	५४९४	९१.५८	१००			
४	नदी नियन्त्रण (संघीय सशर्त) (३१३९११२३४)		१०००० (७१४१)	५००८	५० (७०)	७५			१८३ मी नदि नियन्त्रण । नि. व्या.ले कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको
४	मर्मत कोष (३१३०२१३०११.२.२)		५५०० (५+५००)	५००	१०	१००			२१ मी । ५ लाख को एउटा कार्य सम्पन्न , ५० लाखको कार्यको बोलपत्र आह्वान
	कुल जम्मा (रु. हजारमा)								

आ.ब. २०८२/०८३ बार्षिक प्रगति समीक्षा

संक्षिप्त भौतिक प्रगति विवरण

सिंचित क्षेत्रफल विस्तार

नयाँ क्षेत्रफल विस्तार (Extension) हेक्टरमा-०

पुनर्स्थापना (Rehab.) हेक्टरमा – २०६८

लाभान्वित जनसंख्या- १५१२

नदि नियन्त्रण तर्फ

नदि नियन्त्रण लम्बाइ किलो मिटरमा- ३.३६

जग्गा उकास हेक्टरमा- ५६२

लाभान्वित जनसंख्या- १५४८

उपलब्धि (संरचनागत)

सिंचाई तथा नदि नियन्त्रण तर्फ			
क्र.सं.	संरचनाको नाम	मिटर	कैफियत
1	पक्की कुलो निर्माण	4,848.30	मिटर
2	VRB	10.00	वटा
3	Division Box	3.00	वटा
3	Retaining Wall	380.40	मिटर
4	Gabion Revetment Wall	2,035.60	मिटर
5	HDPE Pipe	4,008.00	मिटर
6	Slopong Embankment	751.00	मिटर
7	Spur	7.00	वटा
8	Porcupine	360.00	मिटर
9	Steel Gate	1.00	वटा
10	Plastic Bag खरिद	10,500.00	थान
11	तारजाली खरिद	251.00	थान
12	Steplizer	1.00	

अवसर, चुनौती तथा सुझाव

योजनाको संख्या धेरै हुनु/ कार्यालय संग समन्वयमा कमि	स्थान सुनिश्चित गर्ने, अनुगमन, मुल्यांकन, नियन्त्रण, मर्मत, संस्थागत विकास (ज.उ.स. दर्ता /नविकरण,तालिम आदि मा समस्या) , कार्यबोझ बढेको
नदी नियन्त्रण सम्बन्धि कार्यविधि नहुनु (सिंचाइ नियमावली मात्रै रहेको)	ज.उ.स गठन, दर्ता, नविकरण तदर्थवादमा आधारित/PAN खोल्ने बन्द गर्न समस्या
आकस्मिक कार्यको लागि कार्यविधि आवश्यक (तारजाली खरिद/ बाँसको कार्य आदि)	एकरूपता नभएको
वृत्ति विकास ठप्प	ओ.एन.एम. छिटो हुनुपर्ने
आवश्यक तालीम	प्राविधिक/कानूनी अद्यावधिक गराइनु पर्ने
बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धमा	सानो टिम गठन गरि स्थलगत रुपमा छलफल गरि फरफारक गर्ने/ Dedicated man power
Data Base Inventory Preparation	Provincial Irrigation Master Plan बनाउन जरुरी/ District Irrigation Profile

अपेक्षित प्रगति नहुने कारणहरू

- पहिलो त्रैमासिक : लेखा परीक्षणका कार्य हरू, जेन-जी आन्दोलन (भाद्र २३/२४), चांडपर्व, सरुवा आदि ।
- जेन-जी आन्दोलन पश्चात भौतिक व्यवस्थापनमा समय लग्नु (मोरङ्गको हकमा)
- शुरु देखिनै वर्षा भैरहनु (प्रि मनसून देखि नै)
- ज.उ.सको नविकरण ढिलो गराउने बानी । (पौष मसान्त सम्म)
- धान वाली भित्राए पछि मात्रै सिंचाइको कार्य हुने गरेको
- बजेट रोक्का / फुकुवाले असमंजस गराएको (२५%, फेरी १०%..)
- रकमान्तर समयमा हुन नसक्नु/नगरिनु
- मूल्य वृद्धिको (इन्धन) कारण कार्य प्रति वास्ता कमहुनु (ज.उ.स/ठेक्का..)
- सानो बजेटका कार्यक्रम प्रति ढिलो मात्रै सम्पर्क गर्नु
- स्थान पहिचानमा समय लाग्नु, समिति गठनमा समय लाग्नु
- ठुलो बजेट रहेका योजनाहरूमा नि.व्या.द्वारा अपेक्षित प्रगति हुन नसक्नु
- बहुवर्षीय स्वीकृतिको आशमा समय व्यतित हुनु/अन्तिममा स्वीकृति नहुनु
- नयाँ नर्म्स प्रयोगमा आएपछि केही दिन कार्य प्रति उदासिन रहनु (दररेट कम हुनु)
- संघीय निर्वाचनले असर पर्नु (कर्मचारी/सरोकारवाला..)
- बिना माग संघ बाट बजेट थप भएर आउनु
- बेरुजु फछ्यौटमा सामुहिक जिम्मेवारी नदेखाउनु/नदेखिनु..



मौलिबरी बक्राहा सि.यो.

प्रदेश मझौला सि.यो. ठेक्का तर्फको

कमलपुर बेलडाँगी लेटाङ्ग सि.यो.







लाटीखोला त्रिशक्ति बाँध
ISIP



सुनझोडा सि. यो.




शान्ति
पथ
सि.यो.





આદર્શ પેની



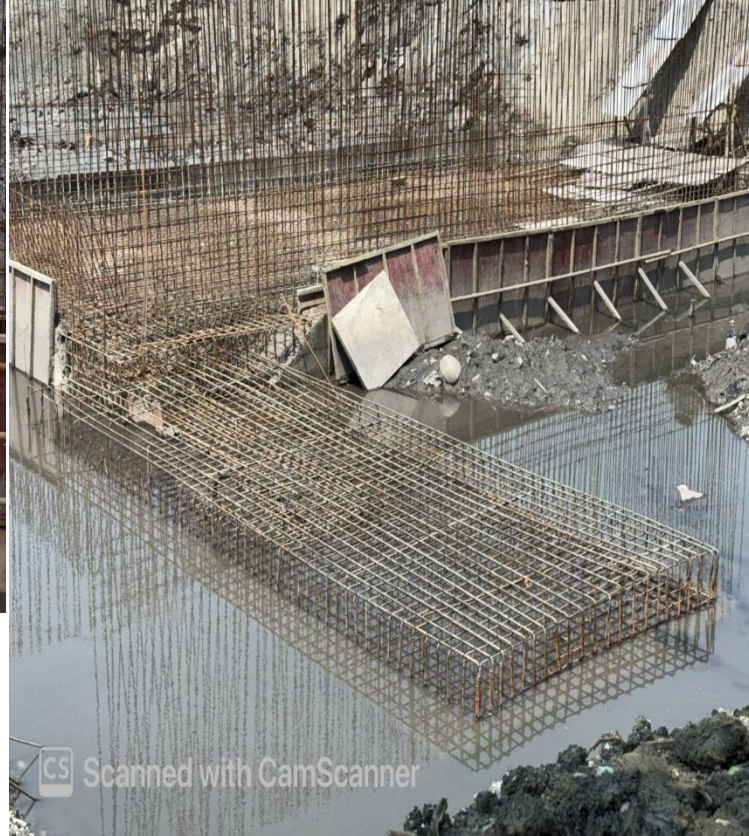

सीता डान्स सि. यो.
अण्डर स्लुस र रिटर्न वाल

ज.उ.स. तालीम





सीता डान्स सि. यो.
सिट पाइलिङ्ग र मास कंक्रीट



सीता डान्स सि. यो.
IMEP, जावलाखेल बाट आएको
टोलीसँग छलफल



भाद्र २४ जेन -जी आन्दोलन



The Roman Aqueduct in Italy, built in 312 BC, 9 wonders in Irrigation Engineering

धन्यवाद्
