



कोशी प्रदेश सरकार

खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालय

विराटनगर, नेपाल

आ.व. २०८२-०८३ को

वार्षिक तथा चौथो त्रैमासिक प्रगति समिक्षा



(मिति २०८३/०८/१२, १३ र १४)



स्वच्छ पिउने पानी




सिंचाई क्षेत्र विस्तार




स्वच्छ ऊर्जा

समन्वय, सहकार्य र
समावेशी विकास

“ गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, पारदर्शिता र जिम्मेवारी
कोशी प्रदेशको समृद्धिको आधार ”

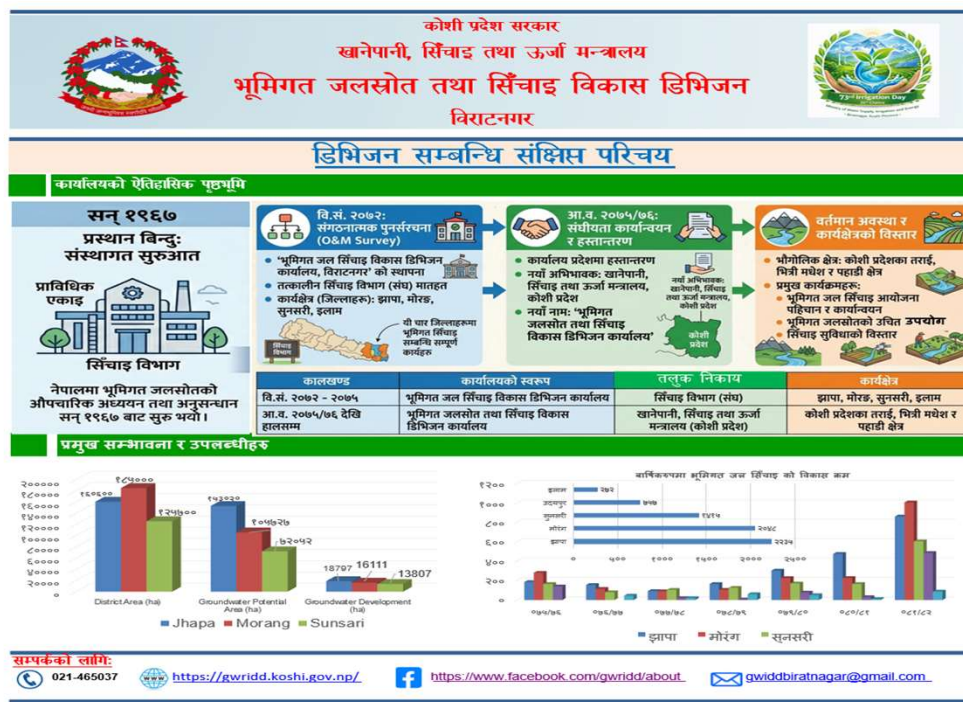

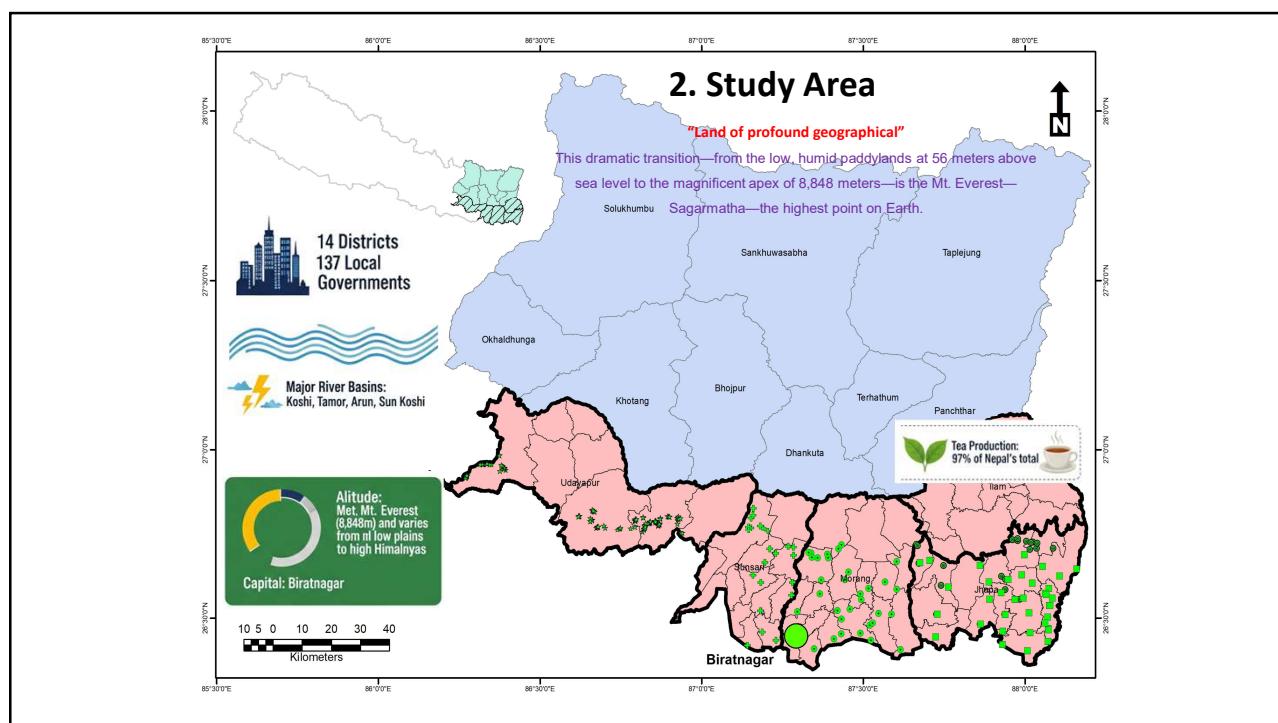

चौथो त्रैमासिकको वित्तिय तथा भौतिक प्रगति

सि.नं.	कार्यक्रम	बजेट (रु. लाखमा)		प्रगति (त्रैमासिक को आधारमा)	
		चौथो त्रैमासिक बजेट	चौथो त्रैमासिक खर्च	वित्तीय %	भौतिक %
(क)	संघ तर्फ (पुँजीगत)	५०	५०	१००	१००
(ख)	प्रदेश तर्फ				
१.	चालु	७६.३४	४९.८३	६५%	
२.	पुँजीगत	६२०.८५	६२०.८५	१००	१००
	जम्मा	६९७.१९	६७०.६८	९६.१९	
	कुल जम्मा	७४७.००	७२१.००	९६.४५	

वार्षिक प्रगति सारांश					
सि.नं.	कार्यक्रम	बजेट		प्रगति (वार्षिक बजेटको आधारमा)	
		वार्षिक बजेट	वार्षिक खर्च	वित्तीय %	भौतिक %
(क)	संघ तर्फ (पुँजीगत)	२००	१७३.०१	८६.५०	१००
(ख)	प्रदेश तर्फ				
१.	चालु	२३३.५७	१९५.०५	८३.५९	
२.	पुँजीगत	१६३९.५०	१६०२.९४	९७.९९	१००
	जम्मा	१८७३.०७	१७९७.९९	९५.९९	
	कुल जम्मा	२०७३.०७	१९७९.००	९५.९०	

आ.व. २०८२-०८३ को कार्यक्रमगत वार्षिक प्रगति विवरण									
सि.नं.	ब.उ.शि.नं.	अन्तिम बजेट (रु. लाखमा)	योजना संख्या			जम्मा खर्च (रु. लाखमा)	वित्तीय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
			जम्मा	सम्पन्न	सम्पन्न हुन नसकेका				
१	313911294-भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युववेल सिँचाई आयोजना(संघ शसर्त अनुदान)	200	2	1	1	173.02	86.5	100	
२	313021023-भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालयहरू	196.57	-	-	-	161.72	82.3	-	
३	313021024-भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालयहरू	37	1	1	-	33.34	90.1	100	
४	313021064-प्रदेश जलस्रोत तथा सिँचाई विकास व्यवस्थापन कार्यक्रम	1639.5	56			1602.94	97.8	100	
	जम्मा	२०७३				१९७९	९५.९		

श्रोत सहमति प्राप्त बहुवर्षीय आयोजनाहरूको विवरण															
सि.नं.	योजनाको नाम	जम्मा स्वीकृत ल.इ.	सम्झौता रकम (रु. हजारमा)				स्वीकृत कन्टेन्जेन्सी	कुल दायित्व	खर्च (रु. हजारमा)				भौतिक प्रगति (%)	वित्तीय प्रगति (%)	कैफियत
			ठेक्का तर्फ	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	ज.उ.स. तर्फ			ठेक्का तर्फ	ज.उ.स. तर्फ	कन्टेन्जेन्सी	कुल			
१	२	३	४	५	६	७	८	९=४+७+८	१०	११	१२	१३= १०+११+१२	१४	१५	१६
१	११.४.१५.१९३३- बसाह डिप ट्युबवेल सिंचाई उप-आयोजना चौदण्डी न.पा.३,४	१०५६८१.६						१०५६८१.६				६४६९५.१	९८	६१.२२	
२	११.४.१५.४४५५- बह्रनडाँगी डिप ट्युबवेल सिंचाई आयोजना, मेची न.पा., झापा	८७६५५.७१						८७६५५.७१				३९७५६.८१	७०	४५.३६	

आ.व. २०८२/०८३ मा संचालित योजनाहरूको उपलब्धि विवरण						
सि.नं.	सूचक	एकाई	गत आ.व. २०८१/०८२ सम्मको उपलब्धि	आ.व. २०८२/०८३ को थप	आ.व. २०८२/०८३ सम्मको जम्मा	कैफियत
१.	नयाँ सिँचाई क्षेत्र विस्तार (सतह सिँचाई)	हेक्टर				
२.	नयाँ सिंचित क्षेत्र विस्तार (भूमिगत सिँचाई)	हेक्टर	६२४३	२२००	८४४२	
३.	सिँचाई क्षेत्र पुनस्थापना	हेक्टर	३६०	१२०	४८०	
४.	बाँध तथा तटबन्धन निर्माण	कि.मि.				
५.	जग्गा उकास क्षेत्रफल	हेक्टर				
६.	साना पहिरो व्यवस्थापन कार्य	सङ्ख्या				

आ.व. ०८२-८३ मा सम्पादन भएका कार्यहरुको शारंशः

• जम्मा आयोजना संख्याः ५६

- मर्मत सम्भार-५,
- नया आयोजनाः २२
- क्रमागतः २९

• ५ लाख भन्दा कम आयोजना संख्याः ३

• बहुवर्षीय आयोजनाहरुः २

• सम्पादन भएका प्रमुख क्रियाकलापहरुः

- स्यालो ट्यूववेल = ६६६
- डिप ट्यूववेल = ७,
- पावर-ड्रिल ट्यूववेल = ३०
- पम्पघर तथा वितरण प्रणाली निर्माण= १२

• अन्वेषणात्मक डिप ट्यूववेल निर्माण कार्य = २

• Geophysical सर्भे = १

• आयोजना हस्तान्तरणः ३

आ.व. २०८३/०८४ प्रदेश मझौला सिँचाइ कार्यक्रम तर्फ संचालन हुने योजनाहरुको विवरण

सि.नं.	योजनाको नाम	सिंचित क्षेत्रफल (हे.)			कुल लागत (रु. हजारमा)	सम्झौता हुने रकम		आ.व. २०८२/०८३ को विनियोजित बजेट	कैफियत
						ठेक्का तर्फ	ज.उ.स. तर्फ		
		नयाँ	पुनर्स्थापना	कुल					
१.	डिप बोरिड सिँचाई योजना, शिवसताक्षी- ९, झापा							१००००	
२.	डिप बोरिड सिँचाई योजना, कोशी गा.पा.- ५, सुनसरी							१००००	
३.	डिप बोरिड सिँचाई योजना, दुहवी- १ र ७, २ स्थान, सुनसरी							१००००	
४.	डिप बोरिड सिँचाई योजना, सुनवर्षी- ३, ४ र ५, पथरीसनिश्चरे- ६, कानेपोखरी- ३, मोरङ							१००००	

आ.व. २०८२/०८३ मा IMEP/ISIP तर्फ संचालित योजनाहरूको विवरण

सि. नं.	योजनाको नाम	सिंचित क्षेत्रफल (हे.)	कुल लागत	सम्झौता		आ.व. २०८२/०८३ को विनियोजित बजेट	आ.व. २०८२/०८३ को खर्च	हालसम्मको खर्च		वित्तीय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
				ठेक्का तर्फ	ज.उ.स. तर्फ			ठेक्का तर्फ	ज.उ.स. तर्फ			
												1 (a)
												1 (b)

नभएको

आ.व. २०८२/०८३ सम्म विस्तृत अध्ययन भएका तर कार्यान्वयनमा नगएका योजनाहरूको विवरण							
सि.नं.	योजनाको नाम	सिंचित क्षेत्रफल (हे.)	कुल लागत (रु. हजारमा)	लाभान्वित घरधुरी	लाभान्वित जनसंख्या	DDR भएको आ.व.	कैफियत
१.	चुलाचुली भूमिगत जल सिंचाइ आयोजना, इलाम	४००	१२४२८५.	५३२	२१४२	२०८०/०८१	प्रदेश योजना आयोगबाट स्वीकृति IEE अध्ययन गर्नु पर्ने
२.	मधुमल्लाहा-मिक्लाजुंग भूमिगत जल सिंचाइ आयोजना, मोरङ	३००	९५२९२.	४९३	१५४७	२०८०/०८१	प्रदेश योजना आयोगबाट स्वीकृति IEE अध्ययन गर्नु पर्ने
३.	धोबियारे भूमिगत जल सिंचाइ आयोजना, ग्रामथान गा.पा. वडा नं. ७, थोबियारे, मोरङ	१६०	४४४२२.	८७	४०५	२०८०/०८१	प्रदेश योजना आयोगबाट स्वीकृति
४.	बगाहा भूमिगत जल सिंचाइ आयोजना, त्रियुगा न. पा. वडा नं. १, २, ३, ४ र ५, उदयपुर	२२५	८९४७२.	५१२	२११७	२०८०/०८१	प्रदेश योजना आयोगबाट स्वीकृति IEE अध्ययन गर्नु पर्ने
	जम्मा	१०८५	३५३४७१.				

आ.व. २०८१-०८२ मा स्वीकृत भएका आयोजनाहरूको विवरण

SN	Name of Project	Location	Command Area (ha)	Nos. GW Irrigation System		Project Cost		Economic Analysis		
				DTWs	PDTWs	Estimated Cost	Cost per Ha.	B/C Ratio	EIRR	NPV
1	Setikhola (Sisauli) Groundwater Irrigation Project	Belka -8, Udayapur and Barahachhetra 6, Sunsari	93	3	2	21,999,280.55	236,551.40	3.49	19.17	43442795.10
2	Barahachhetra Groundwater Irrigation Project	Barahachhetra-2, Sinsari	54	3		13,128,223.88	243,115.26	3.53	19.19	32974312.54
3	Dhobiya Groundwater Irrigation Project, Gramthan-7, Dhobiya, Morang	Gramthan-7, Dhobiya, Morang	160	4		44,422,512.58	277,640.70	2.16	17.38	41205632.18
4	Sundarharaicha-1 GW Irrigation Project, Sundarharaicha 1, Morang	Sundarharaicha 1, Morang	200	5		56,252,130.18	281,260.65	2.09	17.21	23258347.81
5	Dwarkhola (Khumbu Kirati Chowk) Groundwater Irrigation Project, Udayapur	Chaudandigadhi Municipality Ward No. 6, Khumbu-Kirati Chowk, Udayapur	100	3		34,947,307.80	349,473.08	2.23	17.71	32974312.54
6	Babhanadob Groundwater Irrigation Project, Morang	Sunbarsi Municipality, Ward No. 3, Bhabanadob, Morang	120	3		35,967,827.32	299,731.89	1.81	16.37	23258347.81
7	Chakraghatti Power-Drill Tubewell Irrigation Project, Barahachhetra, Sunsari	Barahachhetra 2, 3, 4, 5, 6 and 7, Sunsari	250		50	111,046,587.59	444,186.35	1.37	14.12	32364244.57
8	Sukedangi Power-Drill Tubewell Irrigation Project, Kankai-2, Jhapa	Kankai Municipality-2, Sukedangi, Jhapa	100		20	45,846,890.36	458,468.90	1.4	14.35	14588005.68
9	Chulachuli Groundwater Irrigation Project	Chulachuli Rural Municipality 1, 2, 3 and 4, Illam	400			124,285,556.10	310,713.89	1.89	16.63	21638141.50
10	Madhumalla-Miklajung Groundwater Irrigation Project, Miklajung 6-9, Morang	Miklajung Rural Municipality 6-9, Morang	300	5	20	95,292,723.67	317,642.41	1.91	16.7	68961236.11
11	Arjundhara Power-Drill Tubewell Irrigation Project, Arjundhara, Jhapa	Arjundhara 3-10 and Buddhashanti 2, Jhapa	250		50	110,880,203.84	443,520.82	1.3	13.64	27359348.51
12	Rampur-Thokila Groundwater Irrigation Project, Belaka, Udayapur	Belaka Municipality 3, 4 and 9, Udayapur	250	5	20	98,408,252.09	393,633.01	1.55	15.23	42651357.64
13	Dewanganj Deep Tubewell Irrigation Sub-Project	Dewanganj Rural Municipality Ward No. 1-3, 6, and Harinagara-7, Sunsari	400	9	8	123,205,274.04	308,013.19	2.82	18.63	16979119.37
14	Sonbarsi-Ratuwamai Groundwater Irrigation Sub-Project	Sonbarsi and Ratuwamai Municipality, Morang District	400	10		103,337,655.27	258,344.14	2.65	18.41	19239693.83
15	Bagaha Deep Tubewell Irrigation Project,	Triyuga Municipality Ward No. 1-5, Udayapur	225	5	15	89,472,448.91	397,655.33	1.82	16.6	14304266.44
Total			3302	55	185	1,108,492,874.17				

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग/सतर्कता केन्द्रको उजुरी र उजुरी फछ्यौटको अवस्था

सि.नं.	गत आ.व. बाट जिम्मेवारी सारिएको	चालु आ.व. मा थप भएको	जम्मा	फछ्यौट भएको	बाँकि	कैफियत
१.						
२.						
३.						
४.						

नभएको

मुख्य चुनौति तथा सुझाव

सि. नं.	कार्यान्वयनमा देखा परेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानतर्फ भएका प्रयासहरू
१	कार्यालय भवन जिर्ण, कर्मचारी आवाश भवन नभएको, चारपांग्रे सवारी साधनको अभाव	श्री शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, बिराटनगर, मोरङबाट DPR तयार गरि बहुबर्षीय स्वीकृतिको लागि पेश भएको
२	नयाँ डिप ट्यूबवेल, पावर ड्रिल ट्यूबवेल तथा स्यालो ट्यूबवेल सिँचाइको लागि अत्यधिक धेरै माग निबेदन प्राप्त हुने गरेको,	तालुक निकायमा बजेट व्यवस्थाको लागि लेखिपठाउने गरिएको
३	पुराना तथा संचालनमा रहेका ट्यूबवेल सिँचाइ प्रणालीहरूमा मर्मत सम्भार तथा क्षेत्र विस्तारको लागि धेरै माग आउने गरेको, बजेटको अभाव रहेको	सिमित श्रोत साधनहरूबाट सामान्य मर्मत सम्भार गर्ने गरिएको, मर्मत सम्भारको लागि पर्याप्त बजेट बिनियोजन हुनुपर्ने देखिएको
४	भूमिगत सिँचाइ सम्बन्धि कार्यहरू विभिन्न निकायहरूबाट समेत कार्यान्वयन हुने गरेको, दोहोरोपना हुनु सक्ने सम्भावना रहेको	

- MOWSIE, Koshi बाट Appraisal भई प्रदेश योजना आयोगबाट स्वीकृत भएको तर स्रोत सहमति नभएका ४ आयोजनाहरू – छुट भएको
- MOWSIE, Koshi बाट आ. व. ०८१/८२ मा Appraisal स्वीकृत भएका ११ वटा आयोजनाहरू छुट भएको

- आ.व. ०८२/८३ मा निर्माण सुरु भएका क्रमागत आयोजनाहरु - छुट भएको -
 - ११.४.१५.४८६९-भूमिगत जलश्रोत डिप बोरिङ्ग, बराहक्षेत्र न.पा.३
 - ११.४.१५.४५५८-बर्जु-६ डिप ट्यूबवेल सिँचाइ आयोजना, बर्जु गा.पा.-६, सुनसरी
 - ११.४.१५.४८७४-साखरे डीप बोरिंग सिँचाइ आयोजना (साखरे चिहान डाँडा), मिक्लाजुंग-२, मोरंग
 - ११.४.१५.४८७३-डिप बोरिङ्ग, सिर्वानी बालकृष्ण चौक वरिपरी, चौ.न.पा.६, उदयपुर
 - ११.४.१५.४५५१-लक्ष्मी सामुदायिक डिप ट्यूबवेल सिँचाइ आयोजना, बेलबारी-११, मोरङ्ग



बेरुजुको अवस्था

आ.व.	कायम भएको बेरुजु रकम			बेरुजु फर्छ्यौट भएको रकम				बाँकी बेरुजु		
	नियमित गर्नुपर्ने	असुल उपर गर्नुपर्ने	जम्मा	सं.प. मिति	नियमित गर्नुपर्ने	असुल उपर गर्नुपर्ने	जम्मा	नियमित गर्नुपर्ने	असुल उपर गर्नुपर्ने	जम्मा
२०७५/७६	२२६६४४	९०६७	२३५७१०.८७	-	२२६६४४	९०६७	२३५७११	०	०	-
२०७६/७७	२७७५१०००	४२८५५६	२८१७९५५६	-	२७७५१०००	२४८९५२	२७९९९९५२	०	१७९६०४	१७९६०४
२०७७/७८	१२३७५७०८	१०६१८०	१२४८१८८८	-	११९४७३६२	१६९००	११९६४२६२	४२८३४६	८९२८०	५१७६२६
२०७८/७९	६१४२५०	१००८७४	७१५१२४	-	४७६४०१	०	४७६४०१	१३७८४९	१००८७४	२३८७२३
२०७९/८०	१४६७३९१	१२८७३१	१५९६१२२		१४६७३९१	१३४१७	१४८०८०८	०	११५३१४	११५३१४
२०८०/८१	१३२५८५५	१२३०३३	१४४८८८८		१३२५८५५	०	१३२५८५५	०	१२३०३३	१२३०३३
२०८१/८२	११९६६६५५	८९२३४	१२०५५८८९		९८९६५८३	०	९८९६५८३	२०७००७२	८९२३४	२१५९३०६
जम्मा	५५७२७५०३	९८५६७५	५६७१३१७८	०	५३०९१२३६	२८८३३६	५३३७९५७२	२६३६२६७	६९७३३९	३३३३६०६

बेरुजु फर्छ्यौट प्रतिशत = ९५.७८%

बेरुजुको अवस्था

सि.नं.	गत आ.व. ८१/८२ को बेरुजु रकम	फर्छ्यौट भएको बेरुजुको रकम	फर्छ्यौट हुन बाँकी बेरुजु रकम	प्रगति
१	११९६६६५५	९८९६५८३	२१५९३०६	८२.१०%

नोट:

- बाँकी बेरुजु मध्ये प्रमाण पेश गर्नुपर्ने तर्फ रु. २०७००७२.०० (पाइप जडान कार्य सम्पन्न भई प्रमाण सहित नियमित हुनको लागि मन्त्रालयमा पेश भएको) ।
- बढी ग्रेड भुक्तानी सम्बन्धि रु. ८९२३३.८०- विचाराधीन मुद्दाको फैसला पश्चात मात्र स.प. हुन सक्ने

उपलब्धी सम्बन्धी फोटो (योजना, जिल्ला र कार्य खुल्ने क्यापसन सहित)





पम्प घर निर्माण हुँदै, सुनबर्सी-६, मोरङ



बाहुनडाँगी डिप ट्यूववेल जल सिँचाई आयोजना, मेचीनगर, झापा



पाईप जडान को लागि खनिएको कुलो (बायाँ) र Out-Let निर्माण हुँदै (दायाँ), बाहुनडाँगी, मेचीनगर, झापा



वितरण प्रणालीको पाईप जडान हुँदै, सुन्दरहरैचा-१, मोरङ



पम्पघर निर्माण तथा सब-मर्सिबल पम्प जडान हुँदै, त्रियुगा-५, राईटोल, उदयपुर



स्यालो ट्यूबवेल निर्माण कार्य,




आयोजना समुद्घाटन तथा हस्तान्तरण कार्यक्रम






अन्वेषणात्मक डिप ट्यूवेल निर्माण कार्य, कुमयाक-४, हंगमापोखरी, पांचथर

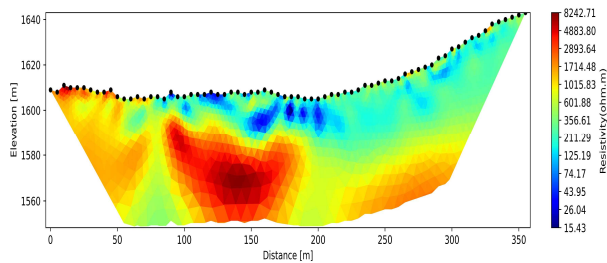

Hangma-1

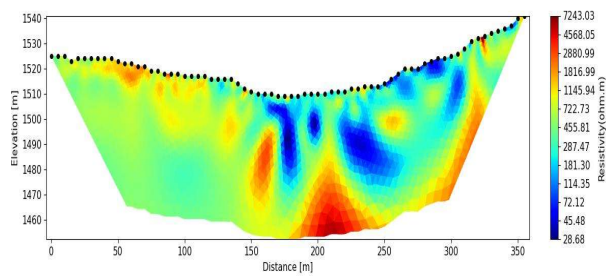

Hangma-2

