



नेपाल सरकार  
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय  
कृषि विभाग



आ. व. २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति विवरण


रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजना

कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ

टीकापुर, कैलाली

(सम्पर्क कार्यालय सुखड)

# रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजना-३

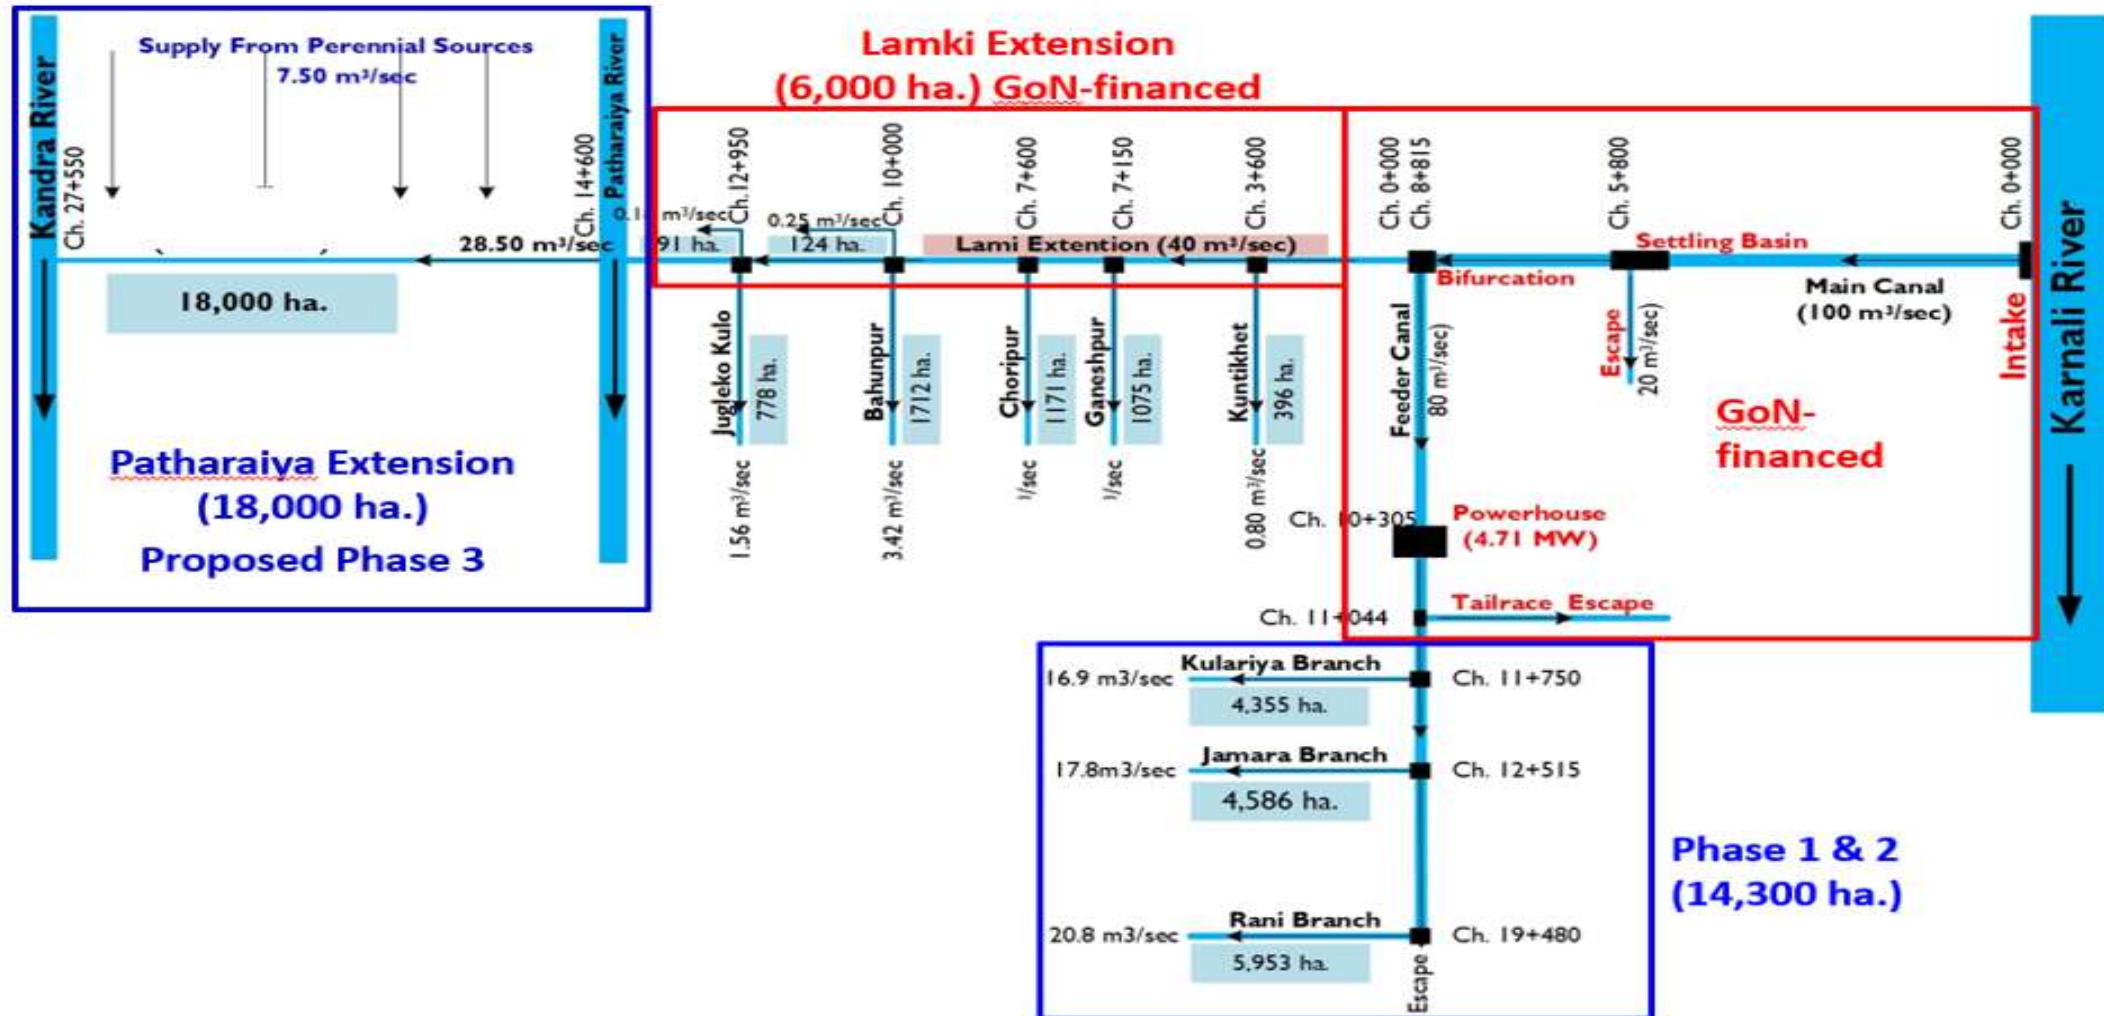




# रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना-३



RJKIP-III

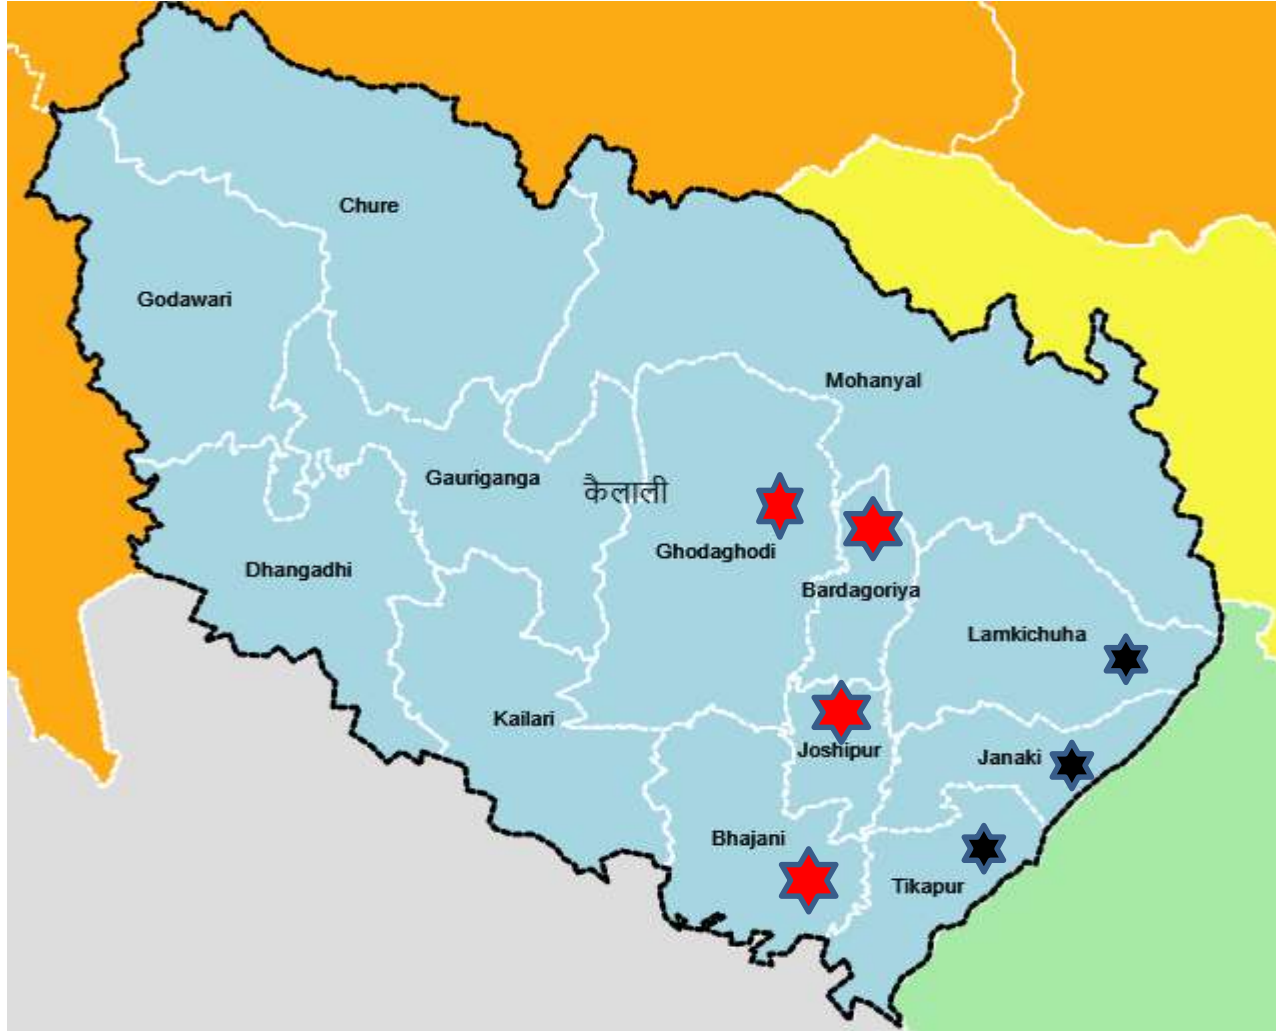

सुरुवात

..... प्रक्षेपित समापन

आ.व.  
२०८२/८३

आ.व.  
२०८७/८८

रा.ज.कु.सि.आ. पहिलो र दोश्रो चरण कार्यक्षेत्र



रा.ज.कु.सि.आ. तेस्रो चरण



# कम्पोनेन्ट र जिम्मेवार निकाय


| कम्पोनेन्ट | कार्यक्रम                          | जिम्मेवार निकाय                                                              | IDA Credit<br>(मिलियन डलर) |
|------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| १          | सिँचाइ पूर्वाधार बिकास             | रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, सिँचाइ विभाग                                | ९५                         |
| २          | जलाधार व्यवस्थापन                  | रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, सिँचाइ विभाग                                | २०                         |
| ३          | कृषि सेवा सहयोग                    | रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, कृषि विभाग | ११                         |
| ४          | संस्थागत सहयोग र आयोजना व्यवस्थापन | रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, सिँचाइ विभाग                                | ११                         |



# रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजना-३



BUDGET OF ACIU IN PHASE-III  
(MILLION USD)

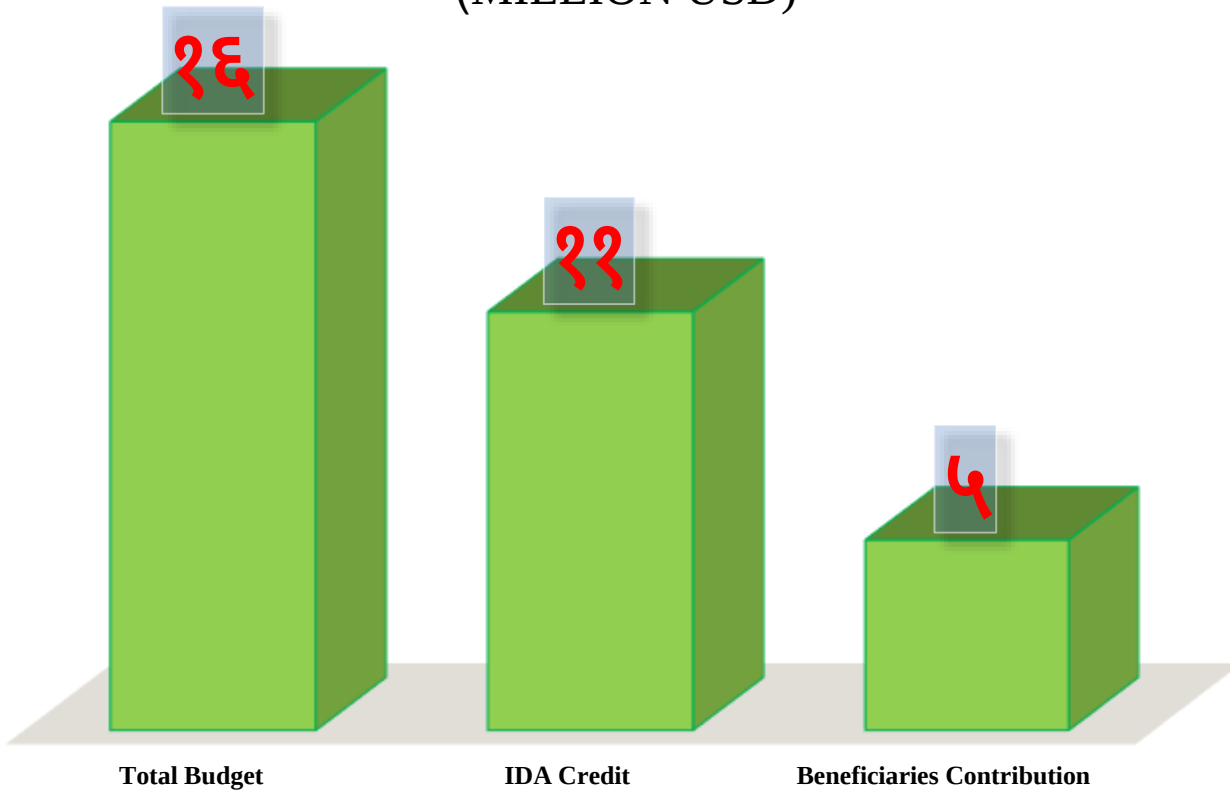

आई.डी.ए. क्रेडिट- ११ मिलियन यु.एस. डलर  
लाभग्राही सहभागिता- ५ मिलियन यु.एस.  
डलर


# आ.व. २०८२/८३ कुल स्वीकृत बजेट रु १८५४०० ('०००)

नेपाल सरकार तर्फ: १ करोड ११ लाख


IDA Credit तर्फ: १७ करोड ४३ लाख

चालु तर्फ: १८ करोड २१ लाख

पूँजीगत तर्फ: ३३ लाख



■ नेपाल सरकार तर्फ

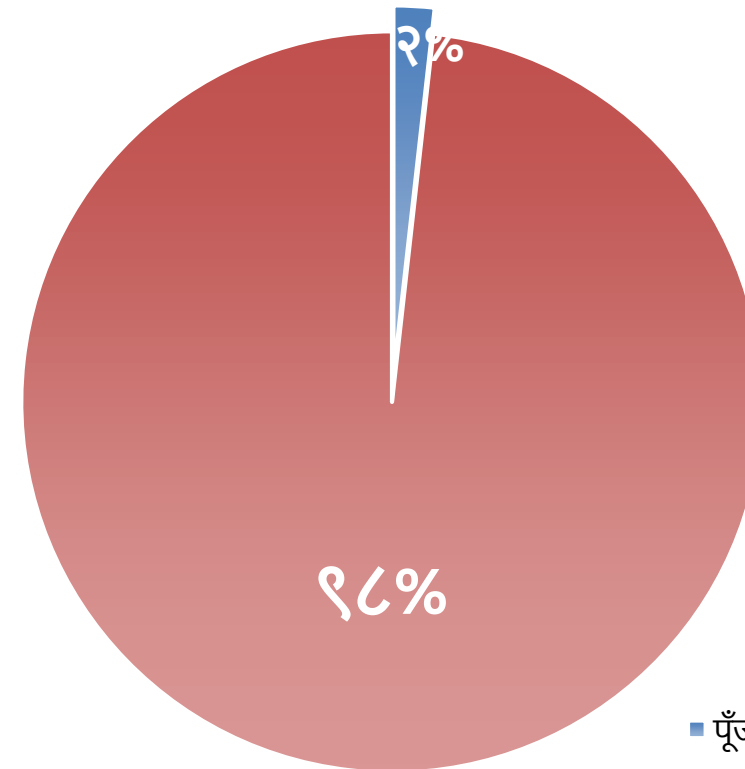

■ पूँजीगत खर्च ■ चालु खर्च

# आ.व.२०८२/८३ को वार्षिक अवधिको भारित तथा वित्तीय प्रगतिको अवस्था

| बजेट उप-शीर्षक<br>नं.  | आयोजना/<br>कार्यक्रमको नाम                             | वार्षिक विनियोजित बजेट<br>(रु हजारमा) |         |        | वार्षिक बजेट खर्च<br>(रु हजारमा) |         |        | वार्षिक अवधिको<br>भारित प्रगति | वार्षिक अवधिको<br>वित्तीय प्रगति |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|----------------------------------|---------|--------|--------------------------------|----------------------------------|
|                        |                                                        | चालु                                  | पुँजिगत | जम्मा  | चालु                             | पुँजिगत | जम्मा  |                                |                                  |
| ३१२०११०७               | रानी जमरा कुलरिया<br>सिँचाइ आयोजना<br>(कृषि कार्यक्रम) | १८२१००                                | ३३००    | १८५४०० | १४१६६३                           | २९९७    | १४४६६० | ८६.१५%                         | ७८.०३%                           |
| P1 कार्यक्रमको एकमुष्ट |                                                        | १८२१००                                | ३३००    | १८५४०० | १४१६६३                           | २९९७    | १४४६६० | ८६.१५%                         | ७८.०३%                           |

# आ.व.२०८२/८३ को चौथो त्रैमासिक अवधिको भारित तथा वित्तीय प्रगतिको अवस्था

| बजेट उप-शीर्षक नं.     | आयोजना/<br>कार्यक्रमको नाम                          | चौथो त्रैमासिक अवधिको लागि विनियोजित बजेट<br>(रु हजारमा) |         |       | चौथो त्रैमासिक अवधिको विनियोजित खर्च बजेट<br>(रु हजारमा) |         |       | चौथो त्रैमासिक अवधिको भारित प्रगति | चौथो त्रैमासिक अवधिको वित्तीय प्रगति |
|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------------------------|---------|-------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                        |                                                     | चालु                                                     | पुँजिगत | जम्मा | चालु                                                     | पुँजिगत | जम्मा |                                    |                                      |
| ३१२०११०७               | रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजना<br>(कृषि कार्यक्रम) | ४३६८६                                                    | ५०      | ४३७३६ | ३०३४३                                                    | ०       | ३०३४३ | ८१.३४%                             | ८३.१९%                               |
| P1 कार्यक्रमको एकमुष्ट |                                                     | ४३६८६                                                    | ५०      | ४३७३६ | ३०३४३                                                    | ०       | ३०३४३ | ८१.३४%                             | ८३.१९%                               |

# आ.व. २०८२/८३ को वार्षिक विनियोजित बजेट र खर्च अवस्था

| बजेट उप-शीर्षक नं.     | आयोजना/ कार्यक्रमको नाम                          | वार्षिक विनियोजित बजेट (रु हजारमा) |         |        | चौथो त्रैमासिक अवधिकोलागि विनियोजित बजेट (रु हजारमा) |         |       | चौथो त्रैमासिक अवधिको खर्च (रु हजारमा) |         |        | चौथो त्रैमासिकको विनियोजित बजेको तुलनामा खर्च प्रतिशत | वार्षिक विनियोजनको तुलनामा चौथो त्रैमासिक खर्च प्रतिशत |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                        |                                                  | चालु                               | पुँजिगत | जम्मा  | चालु                                                 | पुँजिगत | जम्मा | चालु                                   | पुँजिगत | जम्मा  |                                                       |                                                        |
| ३१२०११०७               | रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजना (कृषि कार्यक्रम) | १८२१००                             | ३३००    | १८५४०० | ४३६८६                                                | ५०      | ४३७३६ | ११२२९६                                 | ४३२     | ११२७२८ | २५५.७५                                                | ६०.८०                                                  |
| P1 कार्यक्रमको एकमुष्ट |                                                  | १८२१००                             | ३३००    | १८५४०० | ४३६८६                                                | ५०      | ४३७३६ | ११२२९६                                 | ४३२     | ११२७२८ | २५५.७५                                                | ६०.८०                                                  |

आ.व. २०८२/८३ मा लक्षित क्रियाकलापहरुको लक्ष्य, प्रगतिको अवस्था, प्रमुख उपलब्धिहरु

| क्र. सं. | लक्षित क्रियाकलाप                                                                     | वार्षिक लक्ष्य परिमाण | सम्पन्न परिमाण | खर्च बजेट रु. (लाखमा) |           | आयोजनाहरुको आयोजना अवधिभरको मुख्य उपलब्धिहरु                                                                                                                                                                                                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                       |                       |                | स्वीकृत बजेट          | खर्च बजेट |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १        | बीज बृद्धि कार्यक्रम (धान, गहुँ, मकै आदी) मुल/प्रमाणित वीउ-५० हे. उन्नत वीउ-५० हेक्टर | ३०० हेक्टर            | ९१३ हे.        | १०५                   | १०२.४६    | बीजवृद्धि सहयोग कार्यक्रम मार्फत ९१३ हेक्टर क्षेत्रफलमा बीउ उत्पादनमा संलग्न कृषकहरु/संस्थालाई लागत साझेदारी सहयोग गरी २८५५.७ मेट्रिक गहुँ, तोरी र धानको बीउ (मूल/श्रोत, प्रमाणित/लेबल, उन्नत स्तर) उत्पादन हुने जसबाट बीउ बिजन आत्मनिर्भरमा सहयोग पुग्यो |
| २        | खाद्यन्नबाली (चैते धान र बसन्ते मकै) क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम                         | १७० हेक्टर            | १४२.२ हे.      | ५१                    | ३०.८०     | खाद्यन्नबाली (चैते धान र बसन्ते मकै) क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत चैते धान ५१.३ हेक्टर र बसन्ते मकै ९०.९ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती भई चैते धान २३० मेट्रिक टन धान र ४५४ मेट्रिक टन मकै उत्पादन भई बजारीकरणबाट कृषकहरुको आयआर्जनमा टेवा पुगेको          |
| ३        | आलुको क्षेत्रविस्तारका लागि सहयोग                                                     | २५० हेक्टर            | १५२.८३ हे      | १५०.३                 | ८९.३४     | आलुको क्षेत्रविस्तारका लागि सहयोग १५२.८३ हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती भई ३६६२ मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको। औधोगिक तथा तरकारी प्रयोजनका बिभिन्न जातका आलु बजारीकरण तथा स्वप्रयोग भई २४५ मेट्रिक टन आलु कोल्ड स्टोरेजमा भण्डारण भएको।                        |
| ४        | बेमौसमी तरकारी बाली क्षेत्रविस्तारका लागि सहयोग कार्यक्रम                             | ८० हेक्टर             | ११६.७ हे.      | ४०                    | ३४.११     | बेमौसमी तरकारी बाली क्षेत्रविस्तारका लागि सहयोग कार्यक्रमबाट ११६.७ हेक्टर क्षेत्रफलमा हिउदे तथा बसन्ते तरकारी खेती भई करिब २१०० मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन भएको। उत्पादित तरकारी स्थानिय तथा अत्तरिया, कोहलपुर, नेपालगञ्ज, सुर्खेत बजारमा बजारीकरण भएको।   |

आ.व. २०८२/८३ मा लक्षित क्रियाकलापहरुको लक्ष्य, प्रगतिको अवस्था, प्रमुख उपलब्धिहरु

| क्र. सं. | लक्षित क्रियाकलाप                                         | वार्षिक लक्ष्य परिमाण | सम्पन्न परिमाण | खर्च बजेट रु. (लाखमा) |           | चालू आ.ब.को मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                           |                       |                | स्वीकृत बजेट          | खर्च बजेट |                                                                                                                                                      |
| ५        | केरा खेती सहयोग (उत्पादन/बजारीकरण) कार्यक्रम              | ८० हेक्टर             | ३० हेक्टर      | ८०                    | ३१.६६     | १४ जना कृषकबाट ब्यावसायिक रुपमा ३० हेक्टर केरा खेती बिस्तार भई आगामी बर्ष थप ७५० मेट्रिक टन केरा उत्पादन हुने।                                       |
| ६        | च्याउ खेती प्रबर्द्धनका लागि सहयोग कार्यक्रम              | २५ पटक                | २६ पटक         | १०                    | ८.४२      | ५० जना कृषकहरुले कन्ये तथा गोब्रे च्याउ खेती गरी ५५ मेट्रिक टन कन्ये र १ मेट्रिक टन गोब्रे च्याउ उत्पादन भई कृषकको आयआर्जन प्रबर्द्धनमा सहयोग पुगेको |
| ७        | कृषि उत्पादन विविधिकरण (उद्यमशिलता विकास) सहयोग कार्यक्रम | १० संख्या             | ८              | ४०                    | २४.२२     | कृषि उत्पादन विविधिकरण (उद्यमशिलता विकास) सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत ८ जना कृषकको कृषि ब्यावसाय स्थापना भएको र स्वरोजगारी श्रृजना भएको                 |
| ८        | पशु उत्पादन प्रविधि प्रदर्शन सहयोग कार्यक्रम              | १०० संख्या            | ४९             | १००                   | ७६.९४     | ४९ जना ब्यावसायिक पशुपालक कृषकहरुको गोठ निर्माण/सुधार भई ब्यावसायिक पशुपालनमा टेवा पुगेको                                                            |

आ.व. २०८२/८३ मा लक्षित क्रियाकलापहरुको लक्ष्य, प्रगतिको अवस्था, प्रमुख उपलब्धिहरु

| क्र. सं. | लक्षित क्रियाकलाप                                                                                | वार्षिक लक्ष्य परिमाण | सम्पन्न परिमाण | खर्च बजेट रु. (लाखमा) |           | चालू आ.ब.को मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु                                                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                  |                       |                | स्वीकृत बजेट          | खर्च बजेट |                                                                                                            |
| ९        | पशुपालनको नश्ल सुधार तथा रोग व्यवस्थापन कार्यक्रम (पशु उत्पादन १००% अनुदान)                      | ४० संख्या             | ४०             | २०                    | १८.९९     | १ दिने निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी ११२३ कृषकहरु लाभान्वित भएका                                |
| १०       | बाली तथा पशुबस्तुको On-the Spot/स्थालगत तालिम (१ दिने)                                           | १०                    | १०             | ५                     | ४.५४२     | कृषकहरुको क्षमता विकास तालिम (३ दिने र १ दिने स्थलगत) बाट ४६४ जना कृषकहरुको ब्यावसायिक क्षमता बृद्धि भएको  |
| ११       | व्यावसायिक (कृषि तथा पशु) उत्पादन प्रशोधन तथा बजारीकरण सम्बन्धी तालिम (३ दिने बस्तुगत तेवा सहित) | ८                     | ९              | २०.५                  | १८.३४     |                                                                                                            |
| १२       | कृषक पाठशाला संचालन तथा अनुशरण कार्यक्रम                                                         | ५                     | ५              | ७.५                   | ७.४९      | एक बाली अवधिभरी ५ वटा कृषक पाठशाला सञ्चालनबाट १४१ जना कृषकहरु रोगकीराको एकिकृत ब्यावस्थापन गर्न सक्षम भएका |

आ.व. २०८२/८३ मा लक्षित क्रियाकलापहरुको लक्ष्य, प्रगतिको अवस्था, प्रमुख उपलब्धिहरु

| क्र. सं. | लक्षित क्रियाकलाप                                           | वार्षिक लक्ष्य परिमाण | सम्पन्न परिमाण | खर्च बजेट रु. (लाखमा) |           | चालू आ.ब.को मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                             |                       |                | स्वीकृत बजेट          | खर्च बजेट |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| १३       | चैते धानका लागि floor निर्माण सहयोग Threshing               | २ संख्या              | २              | २०                    | १९.२६     | चैते धान काट्ने सिजनमा बर्षाको पानी पर्ने भएकोले कटानी भएको धान सुकाउने ठाँउको अभाव भई चिस्यान बढी हुन गई उपयुक्त बजार भाउ प्राप्त नभएको साथै चैतेधान थ्रेसिङ्ग गर्न उपयुक्त स्थानको अभाव भएकोले लागत साझेदारीमा २ वटा सहकारीबाट व्यवस्थित चैते धानका लागि Threshing Floor निर्माण भएको। |
| १४       | वीउ उत्पादक संस्थालाई वीउ भण्डारण गृह लगायतका निर्माण सहयोग | २ वटा                 | २              | ५०                    | ४५.४७     | बीउ उत्पादक संस्थालाई २ वटा बीउ भण्डारण गृह लगायतका निर्माण सहयोग भई थप १५० मेट्रिक टन बीउ भण्डारण क्षमताको बिकास भएको                                                                                                                                                                   |
| १५       | शीतभण्डारण गृह निर्माण सहयोग                                | १ संख्या              | १              | ११५                   | २७.५९     | १००० मे.ट. क्षमताको शीतभण्डारण निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको, आलु उत्पादन प्रोत्साहन हुने                                                                                                                                                                                                  |

आ.व. २०८२/८३ मा लक्षित क्रियाकलापहरुको लक्ष्य, प्रगतिको अवस्था, प्रमुख उपलब्धिहरु

| क्र. सं. | लक्षित क्रियाकलाप                                                                | वार्षिक लक्ष्य परिमाण | सम्पन्न परिमाण | खर्च बजेट रु. (लाखमा) |           | चालू आ.ब.को मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                  |                       |                | स्वीकृत बजेट          | खर्च बजेट |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १६       | कृषि हाटबजार स्थापना तथा स्तरोन्नती                                              | २ संख्या              | २              | ५०                    | ३९.४०१    | आयोजना क्षेत्रभित्रका २ वटा कृषि हाटबजारको स्तरोन्नति भई आयोजना क्षेत्रका टीकापुर न.पा. र जानकी गा.पा.का कृषकहरुले उत्पादन गरेको बिशेषगरी तरकारी, फलफूल, च्याउ, माछा बस्तुहरु उपभोक्तालाई सिधै बिक्री गर्न सहज भई कृषकहरुले उचित मूल्य प्राप्त गरेका।                                                                                                                             |
| १७       | कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने कृषि औजार यन्त्र उपकरणमा सहयोग | २०० संख्या            | २००            | ४००                   | ३९५.६५    | १७६ संस्था मार्फत ३७३ जना कृषक/संस्थालाई ४०९ वटा साना ठूला कृषियन्त्र (Power tiller, Roto seed drill/Super seeder, Rotavator, Cultivator, Thresher, Combine Harvester, Tractor , Tractor लगायत) खरिदमा लागत बढीमा ५०% साझेदारी सहयोग भई कृषि यान्त्रीकरणमा टेवा पुगेको, उत्पादन लागत कम्तिमा १५ प्रतिशतले घट्ने साथै कृषि श्रमिक अभावको समस्या समाधान र कृषि ब्यवसायिकरणमा सहयोग। |

# आ.व.२०८२/८३ को वार्षिक प्रगति अपुग र यसका कारणहरू

| क्र. सं.    | कार्यक्रम/क्रियाकलाप                                                                    | एकाई   | बजेट<br>(लाखमा) | वार्षिक वार्षिक लक्ष्य र प्रगति |        |             | प्रगति अपुग हुनुका कारणहरू                                                                            | कैफियत |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------------------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|             |                                                                                         |        |                 | लक्ष्य                          | प्रगति | नपुग प्रगति |                                                                                                       |        |
| २.७.१५.३२८१ | सु.प. विश्वविद्यालय, FOA सँगको सहकार्यमा कृषि कार्यक्रम सञ्चालन                         | पटक    | १०              | १                               | ०      | १           | स्वीकृत कार्यक्रम हुँदा हुँदै पनि श्रोत नमिलेकाले कार्य सम्पन्न भएको तर भुक्तानी गर्न नसकिएको         |        |
| २.७.१५.४०८७ | वार्षिक कार्यक्रमको प्रभाव (before/after effect) drone बाट अध्ययन                       | पटक    | ५               | १                               | ०      | १           | सम्झौतागरी कार्य शुरु भएको तर कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको र कागजात पेश नभएकोले भुक्तानी गर्न नसकिएको |        |
| २.७.१५.२७३९ | कृषि मेला महोत्सव तथा प्रदर्शनीहरूमा सहयोग                                              | पटक    | २               | ४                               | ०      | ४           | सम्झौता भई कार्य सम्पन्न भएतापनि आवश्यक कागजात पेश गर्न असमर्थ भएकोले भुक्तानी गर्न नसकिएको           |        |
| २.७.१५.३०११ | मुक्त कर्मैया र दलित कृषकका लागि तरकारी, च्याउ र अन्य लगायतका उत्पादनमा सहयोग कार्यक्रम | संख्या | १०              | १००                             | २२     | ७८          | लक्षित समुदाय परिचय प्रमाणीकरण जटीलता तथा कम जग्गा जमिनको उपलब्धता।                                   |        |
| २.७.१५.२९३६ | केरा खेती सहयोग (उत्पादन/बजारीकरण) कार्यक्रम                                            | हेक्टर | ८०              | ८०                              | ३०     | ५०          | गुणस्तरीय केराको बेर्नाको अप्रयाप्तताका कारण र लगाउने समय र भुक्तानी मितिको तादम्यता नमिलेको          |        |
| २.७.१५.२९४२ | फलफूल बगैंचा बिस्तार कार्यक्रम                                                          | हेक्टर | २०              | २०                              | २.५    | १७.५        | आर्थिक वर्षको अन्तिम भएको र ब्यावसायिक रुपमा बगैंचा स्थापना गर्न कृषकहरुले चासो कम देखाएको            |        |
| २.७.१५.२७७२ | आलुको क्षेत्रविस्तारका लागि सहयोग                                                       | हेक्टर | १५०.३           | २५०                             | १५२.८  | ९७.२        | लक्ष्यानुसार कम क्षेत्रफलकालागि माग आवेदन प्राप्त भएकोले तथा गुणस्तरीय बीउ आलुको कम उपलब्धताले गर्दा। |        |

# लक्ष्य नतोकिएका अन्य सम्पादित कार्यहरुको प्रगति विवरण

| क्र.स. | सम्पादित कामको विवरण                                                                                  | परिमाण | सम्पादित कामबाट प्राप्त उपलब्धिहरु                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १.     | आयोजनाको PAD, PIM, LMP, SEP, ESMP, PMP, M&E guiding document preparation मा WB आवश्यक सहजीकरण गरिएको। | -      | Guiding documents prepared भएको। समस्या समाधानमा कोशेढुंगा। WB team सँग intact coordination। प्रभावकारी रुपमा कार्यक्रम कार्यान्वयनम सहयोग पुगेको                        |
| २.     | बसन्ते मकैको अमेरिकन फौजीकीरा र चैतेधानको बेर्ना कुहिने रोगको सफल ब्यावस्थापन                         | -      | कृषकहरुलाई प्राविधिक तथा अभियानको रुपमा बाली संरक्षण सेवा प्रदानबाट बसन्ते मकै र चैतेधान रोगकीराबाट हुने क्षति न्यूनिकरण भै उत्पादन बृद्धिबाट कृषकहरु लाभान्वित भएका     |
| ३.     | केराको TR 4 रोग फैलिन नदिन अभियान तथा ब्यावस्थापन                                                     | -      | बिश्वसनिय र आधिकारिक श्रोतकेन्द्रको बेर्नामा मात्र सहयोग गरेको तथा केरा बगैँचा सुरक्षण प्रोटोकल लागू गरेको। केरा उत्पादक कृषकहरु रोगको बारेमा पूर्ण सचेत र जानकारी भएका। |

# बेरुजु र राजस्वको स्थिति सम्बन्धी विवरण

## क. बेरुजु विवरण

| क्र.स. | विवरण               | असुल उपर गर्नुपर्ने रु. | पेशकी बेरुजु रु. | नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु रु. | जम्मा बेरुजु रकम रु. | कैफियत                                       |
|--------|---------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| १      | आ.व. २०८०/८१ सम्मको | ७३३५५०                  | ८००००            | १०१७१९६.४१                   | १८३०७४६              |                                              |
| २      | आ.व. २०८१/८२ को     | २७२९                    | ०                | २६१७८१०                      | २६२०५३९              | बेरुजु फछ्यौटको लागि कृषि विभागमा पेश गरिएको |
| जम्मा  |                     | ७,३३,२७९                | ८०,०००           | ३६,३५,००६                    | ४४,५१,२८५            |                                              |

## ख. राजस्व विवरण

| क्र.स. | राजस्वको विवरण            | राजस्व दाखिला | कैफियत                                                                                                                       |
|--------|---------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १      | अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क | ६१०००         | बोलपत्रदाताले बोलपत्र खरिद गर्दाको                                                                                           |
| २      | धरौटी सदरस्याहा           | ८३०८२         | कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने कृषि औजार यन्त्र उपकरणमा सहयोग र शीतभण्डारण गृह निर्माण सहयोग कार्यक्रमबाट |
| ३      | बेरुजु                    | २४७५०         |                                                                                                                              |
| जम्मा  |                           | १,६८,८३२      |                                                                                                                              |

# बाली कटानीको नतिजा (नयाँ कार्यक्षेत्रको)

धान

गहुँ

| क्र.सं. | जात          | उत्पादकत्व (मे.ट./हे.) | क्र.सं. | जात          | उत्पादकत्व (मे.ट./हे.) |
|---------|--------------|------------------------|---------|--------------|------------------------|
| १       | सर्जु-५२     | ४.९७                   | १       | बाँणगंगा     | २.१८                   |
| २       | राधा-४       | ४.६६                   | २       | जिङ्ग गहुँ १ | ३.४७                   |
| ३       | सावित्री     | ४.४१                   | ३       | एन.एल. ९७१   | ३.६८                   |
| ४       | सावा-मन्सुली | ४.५८                   | ४       | बिजय         | २.८९                   |
|         |              |                        | ५       | बोर्लाड २०२० | २.६८                   |
|         |              |                        | ६       | आदित्य       | ३.३                    |
|         |              |                        | ७       | गौतम         | ३.९                    |

|                                                                           |                           |         |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|--------------------------------|
| उत्पादकत्व<br>(मे.ट./हे.)                                                 | २०८०/८१                   | २०८१/८२ | २०८२/८३                        |
|                                                                           | ४.४७                      | ४.७     | ४.६६                           |
|                                                                           | दोस्रो चरणको कार्यक्षेत्र |         | तेस्रो चरणको थप कार्यक्षेत्रको |
| आ.व. २०८२/८३ कैलाली जिल्लाको उत्पादकत्व ४.६ मे.ट./हे., कृषि ज्ञान केन्द्र |                           |         |                                |
| आ.व. २०८२/८३ राष्ट्रिय उत्पादकत्व ४४.१९ मे.ट./हे. कृषि डायरी, २०८३        |                           |         |                                |

| उत्पादकत्व<br>(मे.ट./हे.)                                                 | २०८०/८१                   | २०८१/८२ | २०८२/८३                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------------------|
|                                                                           | ४.१४                      | ४.३८    | ३.०७                              |
|                                                                           | दोस्रो चरणको कार्यक्षेत्र |         | तेस्रो चरणको थप<br>कार्यक्षेत्रको |
| आ.व. २०८२/८३ कैलाली जिल्लाको उत्पादकत्व ३.४ मे.ट./हे., कृषि ज्ञान केन्द्र |                           |         |                                   |
| आ.व. २०८२/८३ राष्ट्रिय उत्पादकत्व ३.० मे.ट./हे. कृषि डायरी, २०८३          |                           |         |                                   |

# बाली कटानीको नतिजा

## आलु (नयाँ कार्यक्षेत्र)

| क्र.सं. | जात               | उत्पादकत्व (मे.ट./हे.) |
|---------|-------------------|------------------------|
| १       | कार्डिनल          | १४.८३                  |
| २       | थारू आलु          | १६.२०                  |
| ३       | Alverstone Russet | २०.०६                  |
| ४       | खुमल सेतो         | १६.७९                  |

उत्पादकत्व (मे.ट./हे.)

२०८२/८३


१६.९७

राष्ट्रिय उत्पादकत्व १६.६८ मे.ट./हे., कृषि  
डायरी, २०८३




# शीत भण्डार गृह निर्माणमा आ.व २०८२/८३ को प्रगति विवरण

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Contract ID: NP-DOA/MRJKIP/W-01/082/83; Civil works for Cold Store Facility</p> <p>सम्झौता रकम: रकम रु. ५९,१५,४५२/-</p> <p>मिति २०८३/०१/२५</p> <p>निर्माण व्यवसायी: श्री डोलेश्वोर महादेव निर्माण तथा सप्लायर्स प्रा.लि.</p> <p>भौतिक प्रगती: ४०% समग्रमा ९४%</p> | <p>Contract ID: NP-DOA/MRJKIP/W-02/082/83; Electric &amp; Refrigeration Works for Cold Store Facility</p> <p>सम्झौता रकम: रु ७५,५१,४६२/-</p> <p>मिति २०८३/०१/२५</p> <p>निर्माण व्यवसायी श्री डोलेश्वोर महादेव निर्माण तथा सप्लायर्स प्रा.लि</p> <p>भौतिक प्रगति: २०%</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




# आ.व. २०८२/८३ को कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट लाभान्वित लाभग्राहीको विवरण

## लैङ्गिक वर्गीकरण



## सामाजिक वर्गीकरण



## जनशक्ति विवरण

| क्र.स. | पद                             | श्रेणी              | सेवा                    | स्वीकृत दरबन्दी | पदपूर्ति | कैफियत                           | अस्थायी<br>दरबन्दी<br>स्वीकृत |
|--------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| १      | आयोजना कोअर्डिनेटर             | रा.प.द्वि.प्रा.     | नेपाल कृषि              | १               | १        | स्थायी कर्मचारीबाट पदपूर्ति भएका |                               |
| २      | कृषि अधिकृत                    | रा.प.तृ.प्रा.       | नेपाल कृषि              | ३               | ३        |                                  |                               |
| ३      | पशु विकास अधिकृत/ पशु चिकित्सक | रा.प.तृ.प्रा.       | नेपाल कृषि              | १               | १        |                                  |                               |
| ४      | नायब सुब्बा                    | रा.प.अनं.प्र.       | नेपाल प्रशासन           | १               | १        |                                  |                               |
| ५      | लेखापाल                        | रा.प.अनं.प्र.       | नेपाल प्रशासन           | १               | १        |                                  |                               |
| ६      | प्राविधिक सहायक                | रा.प.अनं.प्र.प्रा.  | नेपाल कृषि              | ३               | ३        |                                  |                               |
| ७      | प.से.प्रा./प.स्वा.प्रा.        | रा.प.अनं.प्र.प्रा.  | नेपाल कृषि (ला.पो./भेट) | १               | ०        |                                  |                               |
| ८      | कम्प्युटर अपरेटर               | रा.प.अनं.प्र.प्रा.  | विविध                   | १               | १        | करार बाट पदपूर्ति भएका           |                               |
| ९      | नायव प्राविधिक सहायक           | रा.प.अनं.द्वि.प्रा. | नेपाल कृषि              | २               | ०        |                                  |                               |
| १०     | कार्यालय सहयोगी                | श्रेणीविहिन         | नेपाल प्रशासन           | ५               | ५        |                                  |                               |
| ११     | हलुका सवारी चालक               | श्रेणीविहिन         | नेपाल इन्जी.            | १               | १        |                                  |                               |
| जम्मा  |                                |                     |                         | २०              | १७       |                                  |                               |

### Program: LMBIS मा स्वीकृत भएका

| क्र.स. | पद                              | संख्या | समूह                   | Time Basis   |
|--------|---------------------------------|--------|------------------------|--------------|
| १      | सिभिल इन्जिनियर                 | १      | Consulting Service     | Full time    |
| २      | कृषि व्यवसाय बिज्ञ              | १      |                        |              |
| ३      | Refrigeration/Mechanical Expert | १      | Consulting Service     | Intermittent |
| ४      | Procurement Specialist          | १      |                        |              |
| ५      | नायव प्राविधिक सहायक            | ३      | Non-consulting Service | Full time    |

# सुशासन प्रवर्द्धन तथा सेवा प्रवाह सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित प्रगति विवरण

| क्र.सं. | सुशासनका सुचकहरु                                               | प्रगतिको अवस्था | प्रगति सम्बन्धी थप व्याख्या                       | प्रगति हुन नसकेको भएमा कारणहरु |
|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| १       | नागरिक वडापत्र तयारी तथा प्रकाशन भए/नभएको                      | भएको            | भएको                                              |                                |
| २       | नियमित स्टाफ बैठक बस्ने गरेको/नगरेको                           | गरेको           | न्यूनतम महिनाको २ पटक                             |                                |
| ३       | प्रत्येक कर्मचारीलाई कार्य विवरण दिएको/नदिएको                  | दिईएको          | भएको                                              |                                |
| ४       | जिन्सी निरीक्षण कार्य सम्पन्न भएको/नभएको                       | भएको            | भएको                                              |                                |
| ५       | लिलाम सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भए/नभएको                          |                 | लिलाम गर्नुपर्ने रकम धेरै नभएकोले ब्यवहारिक नभएको |                                |
| ६       | हाजिरी विवरण अद्यावधिक भए/नभएको                                | भएको            | ईलेक्ट्रोनिक हाजिरी....                           |                                |
| ७       | कासमू समयमै भरी मूल्यांकन भए/नभएको                             | भएको            | भएको                                              |                                |
| ८       | सोधपुध/सहायता कक्ष व्यवस्था भए/नभएको                           | भएको            | भएको                                              |                                |
| ९       | सुचनापाटीको व्यवस्था भए/नभएको                                  | भएको            | भएको                                              |                                |
| १०      | उजुरी पेटिकाको व्यवस्था भए/नभएको                               | भएको            | भएको                                              |                                |
| ११      | वेभसाइट अद्यावधिक भए/नभएको                                     | भएको            | भएको                                              |                                |
| १२      | वार्षिक प्रगति पुस्तिका प्रकाशन र वेभसाइटमा अद्यावधिक भए/नभएको | भएको            | भएको                                              |                                |
| १३      | सुचना अधिकारी तोकिएको/नतोकिएको                                 | तोकिएको         | भएको                                              |                                |
| १४      | स्वत प्रकाशन हुने सुचना वेभसाइटमा अद्यावधिक भए/नभएको           | भएको            | भएको                                              |                                |
| १५      | कर्मचारी लगबुक व्यवस्थापन र समय पालना भए/नभएको                 | भएको            | भएको                                              |                                |

# भौतिक सम्पतिहरुको विवरण

| क्र.सं. | प्रमुख जिन्सी मालसामानहरु | जिन्सीको उपयोग अवस्था |                  |                  |                    | जम्मा | कैफियत                                                 |
|---------|---------------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|-------|--------------------------------------------------------|
|         |                           | चालु हालतमा रहेको     | मर्मत गर्नुपर्ने | लिलाम गर्नुपर्ने | संरक्षण गर्नुपर्ने |       |                                                        |
| १       | चारपाङ्ग्रे सवारी साधन    | ०                     | १                | ०                | ०                  | १     | २०८१/०३/११ गते दुर्घटनामा परि पटक पटक मर्मत गर्नुपर्ने |
| २       | मोटरसाइकल/स्कुटर          | १४                    | ०                | ०                | ०                  | १४    |                                                        |
| ३       | ल्यापटप कम्प्यूटर         | ७                     | ३                | ५                | ०                  | १५    |                                                        |
| ४       | डेस्कटप कम्प्यूटर         | १२                    | ०                | ५                | ०                  | १७    |                                                        |
| ५       | क्यामरा                   | १                     | ०                | ५                | ४                  | १०    |                                                        |
| ६       | फोटोकपी मेशिन             | ०                     | ०                | १                | ०                  | १     |                                                        |
| ७       | प्रिन्टर                  | १६                    | ३                | २                | ०                  | २१    |                                                        |
| ८       | जेनेरेटर                  | २                     | ०                | ०                | ०                  | २     |                                                        |
| ९       | कार्यालय भवन              | १                     | १                | ०                | ०                  | २     | १ वटा भवन भूमिगत जल सिँचाई कार्यालयले प्रयोग           |

कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था

# Farm Mechanization support program, 2082/83 -A gist

direct cash investment support to farmer not more than 50% amount...

## Demand status from farmers

| Demanded machies      | Power Tiller | Power Tiller Reaper | Cage Wheel (PT) | Connector | Hubconnector | Combine Harvester | Tractor | Tractor Trolley | Baller | Paddy Thresher | Wheat Thresher | Maize Thresher | Rotavator | Roto seed drill/Super seeder | Seed cum ferti drill | Cultivator (Tractor drawn) | Disc Harrow | Ridger (Tractor drawn) | Paddy Transplanter | Paddy drier | Diesel Loader | Power sprayer | Seed grader machine | Silage making machine | Straw Reaper | Pellet making machine | Electric chaff cutter | Potato planter | Potato harvester | Other | Total  |
|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------|-----------------|--------|----------------|----------------|----------------|-----------|------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------|-------|--------|
| Number                | 959          | 286                 | 87              | 6         | 2            | 44                | 47      | 70              | 2      | 38             | 24             | 15             | 189       | 22                           | 9                    | 12                         | 117         | 20                     | 3                  | 5           | 8             | 32            | 5                   | 1                     | 35           | 24                    | 66                    | 2              | 1                | 81    | 2212   |
| Need budget NRs."000" | 95900        | 8580                | 522             | 30        | 8            | 118800            | 41125   | 14000           | 500    | 7220           | 3360           | 2100           | 15120     | 4400                         | 1125                 | 360                        | 8190        | 460                    | 2700               | 5500        | 2400          | 576           | 2000                | 500                   | 10500        | 672                   | 1188                  | 360            | 140              | 4860  | 353196 |

## No. of Demanded and benefited Farmers


## No. of farm machineries supported (18 kind of machines)

| Machines | Power Tiller | Power Tiller Reaper | Cage Wheel (PT) | Combine Harvester | Tractor | Tractor Trolley | Paddy Thresher | Maize Thresher | Rotavator | Roto seed drill/Super seeder | Seed cum ferti drill | Cultivator (Tractor drawn) | Disc Harrow | Ridger (Tractor drawn) | Seed grader machine | Straw Reaper | Pellet making machine | Electric chaff cutter | Total |
|----------|--------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------|-----------------|----------------|----------------|-----------|------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| Number   | 181          | 65                  | 12              | 3                 | 1       | 4               | 5              | 1              | 63        | 8                            | 3                    | 3                          | 35          | 5                      | 1                   | 2            | 1                     | 16                    | 409   |

| Demanded no. of farmers | Benefited no. of farmers | Short fall |
|-------------------------|--------------------------|------------|
| 1352                    | 373                      | 979        |

| No. of Beneficiaries of different Local bodies |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Tikapur Municipality                           | 34  |
| Janaki Rural Municipality                      | 55  |
| Lamkichuha Municipality                        | 5   |
| Joshiapur Rural Municipality                   | 124 |
| Bhajani Municipality                           | 64  |
| Ghodaghodi Municipality                        | 57  |
| Bardagoriya Rural Municipality                 | 34  |

## Gap sowing demand and supported number of machines and budget, graph

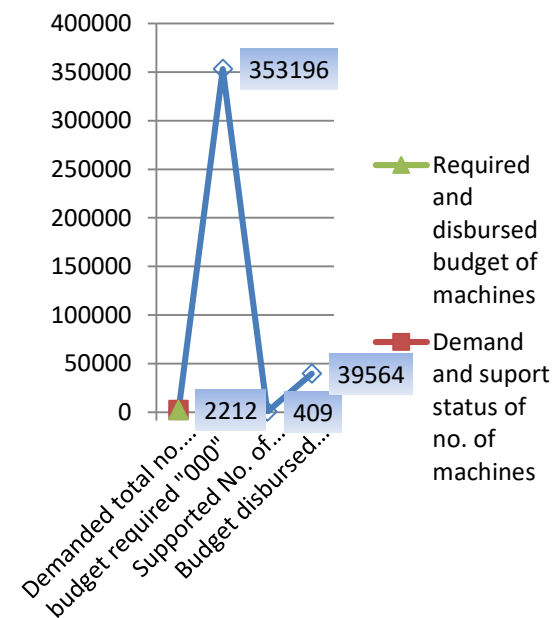

## Effectiveness and impact of use of Agricultural machineries:

- ❖ For land preparations : Machinery takes 2.48 hour/ha, compare to 71.19 hr/ha with labor-a time saving of 68.72 hr/ha.
- ❖ Machines costing Rs. 5127.49/ha versus human labor Rs.10,011.81/ha for land preparation operations.
- ❖ Over all at least 20 % cost savings while using machines
- ❖ In conclusion, farm mechanization promoted commercialization of farming and helped solving labor scarcity problems of the present scenario.
- Source: Project study of output from RJKIP-II interventions, 2025



Roto Seed Drill



Straw Reaper- for straw collection



Combine Harvester



आ.व. २०८२/८३ मा कृषियन्त्र मेशिनरीमा आयोजनाबाट कृषकलाई ५०% लागत साझेदारी सहयोग ३७३ जना कृषक प्रत्यक्ष लाभान्वित



जोशीपुर गा.पा.-३, मनिकापुर, कैलाली



बर्दगोरिया गा.पा.२, दोधरा, कैलाली



टीकापु न.पा-१, कैलाली



१५२.८३ हेक्टर  
क्षेत्रफलमा आलु खेती  
सहयोग भएको। हाल  
२४५ मे.टन बीउ आलु  
कोल्ड स्टोरेजमा  
भण्डारण



केरा बेर्ना रोप्दै टीकापुर-८, कैलाली



हुर्किदै गरेको केरा बेर्ना.... टीकापुर न.पा-८, कैलाली



केरा फिल्ड, टीकापुर न.पा-४, कैलाली



केरा बजारीकरणकोलागि प्याकेजिङ्ग हुदै... जानकी गा.पा.-७, कैलाली

थप ३० हेक्टर  
क्षेत्रफलमा केरा खेती  
सहयोग भएको। हाल  
कृषकले प्रति दर्जन  
७०-८०रुपैयासम्म  
प्राप्त गरेका -  
कृषकहरु उत्साहित।  
तर नर्सरीमा केरा बेर्ना  
आपूर्ति कम भएको  
साथै केरा बेर्नाको मूल्य  
अस्वाभिक बढेको.....



Banana marketing.mp4

बर्षेभरी केरा बेर्ना  
रोप्रेगरी कार्यक्रम  
अगाडी बढाईएको



च्याउ प्रवर्धन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत ब्यावसायिक रुपमा गरिएको च्याउ खेती, बर्दगोरिया-०६, जगतपुर, कैलाली - कृषकको आय आर्जन बृद्धिमा सहयोग भएको



मुक्तकमैया तथा दलित कृषककालागि आय आर्जनमा सहयोग भएको, घोडाघोडी-०८, आमफाँटा, कैलाली



खप्तड कृषि फर्म is with Suman Baidya and 18 others at K...

July 16 at 3:37 PM · Kailali ·

Asarai Mahinama Classical Flute Instrumental · Broken Heart ·



Cucumber 🥒



कृषि उत्पादन विविधिकरण (उद्यमशिलता विकास) सहयोग कार्यक्रम  
(खप्तड पशुपंक्षी तथा कृषि फर्म, जानकी गा.पा.- ५, पहाडीपुर, कैलाली -  
युवा कृषक, स्वरोजगारी श्रृजना भएको ..... लागत साझेदारी सहयोग ४  
लाख



यस बर्ष २  
वटा बीउ  
भण्डारण  
गोदाम थप  
भई थप १५०  
मे. टन. बीउ  
भण्डारण  
क्षमता बृद्धि  
भएको

वीउ उत्पादक संस्थालाई ५० मेट्रिक टन क्षमताको वीउ भण्डारण गृह (किसान मल्टीप्रपोज प्रा.ली. टीकापुर, कैलाली)



कृषि बाली बस्तु बजारीकरण सहजिकरणकालागि कृषि  
हाटबजार स्थापना तथा स्तरोन्नती (टीकापुर, कैलाली) -  
उत्पादक कृषक → उपभोक्ता



सिँचाईको प्रभाव समेतले गर्दा बसन्ते सिजनमा मकै खेती बिस्तार हुदै- आयोजनाको लागत साझेदारी सहयोगमा ९०.९ हेक्टर क्षेत्रफलमा बसन्ते मकै खेती भएको। आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुगेको।

ब्यवसायिक रुपमा  
गरिएको चैते धान  
खेती -घोडाघोडी  
न.पा.-२ सिरानगर,  
कैलाली, कृषक  
दुतराम चौधरी (५  
हेक्टर), जात चैते ५



चैते धान  
जोशिपुर गा.पा.-  
४ हस्नापुर  
कैलाली

आयात  
प्रतिस्थापनकोलागि  
आयोजनाको  
लागत साझेदारी  
सहयोगमा ५१.३३  
हेक्टर क्षेत्रफलमा  
चैतेधान खेती  
बिस्तार भएको-  
(उत्पादकत्व-५.१)



रासायनिक मलको बिकल्पको  
रूपमा माटोको उर्वराशक्ति  
कायम राख्नकोलागि  
आयोजनाको लागत साझेदारी  
सहयोगमा हरियो मल ढैंचा  
खेती बिस्तार (जम्मा क्षेत्रफल  
८.५ हेक्टर)

रासायनिक मलको बिकल्प, ढैंचा खेती बिस्तार-घोडाघोडी-११ अम्बासा, ढैंचा बीउमा ५० % लागत साझेदारी सहयोग

# पशु उत्पादन प्रविधि सहयोग कार्यक्रम



पशु उत्पादन प्रविधि सहयोग कार्यक्रम  
अन्तर्गत मझौला फार्म सुधार  
क्रियाकलापबाट सहयोग (१ लाख) प्राप्त  
बंगुर फार्म-लम्कीचुहा न.पा.-१० कैलाली  
(सनराईज एग्रो फार्म)



प्रविधि  
हस्तान्तरण  
तथा  
कृषकहरु  
को क्षमता  
अभिवृद्धि  
कोलागि  
आयोजना  
द्वारा  
गरिएका  
प्रयासहरु -  
कृषक  
पाठशाला,  
स्थलगत  
तालिम,  
स्थलगत  
सिकाई  
तथा  
सिकाई  
आदान  
प्रदान





Visit to ACIU supported activities during 2<sup>nd</sup> Implementation Support Review Mission February 4-12



पुर्व कृषि माननीय कृषि मन्त्री डा. मदन परियारज्यू टीकापुरका केरा उद्धमीसँग छलफलमा



आयोजना कोअर्डिनेटर रानी जमरा (सिँचाइ तर्फ) टिमलाइ समग्र अवस्थाको बारे जानकारी दिदै



आयोजनाको लागत साझेदारीमा १००० मेट्रिक टन क्षमताको कोल्ड स्टोरेज निर्माण सम्पन्न हुदै .. यस बर्ष **Electrical , Refrigeration and Civil works for Cold Store Facility - A milestone for Potato Production**  
(Completion deadline - December 2026)

आ. व.२०८३/८४ को  
वार्षिक कार्यक्रम

---

## आ.व. २०८३/८४ कुल बजेट रु. ३०९३ (लाखमा)


### बजेटको स्रोत (लाखमा)

नेपाल सरकार : १०३

IDA Credit : २९९०

जम्मा : ३०९३

### बजेटको स्रोत

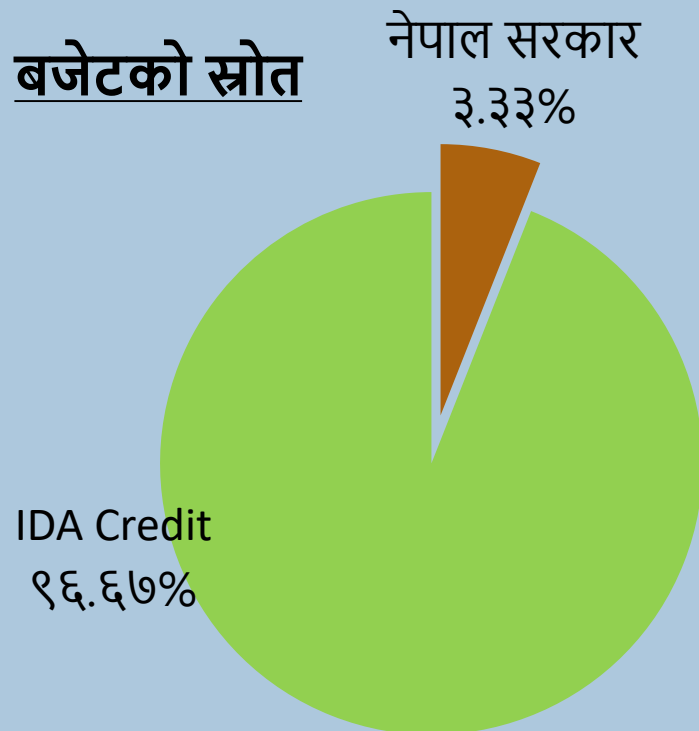


### चालु तथा पुँजीगत बजेट (लाखमा)

चालु : ३०५८

पुँजीगत : ३५

जम्मा : ३०९३

### चालु तथा पुँजीगत बजेट

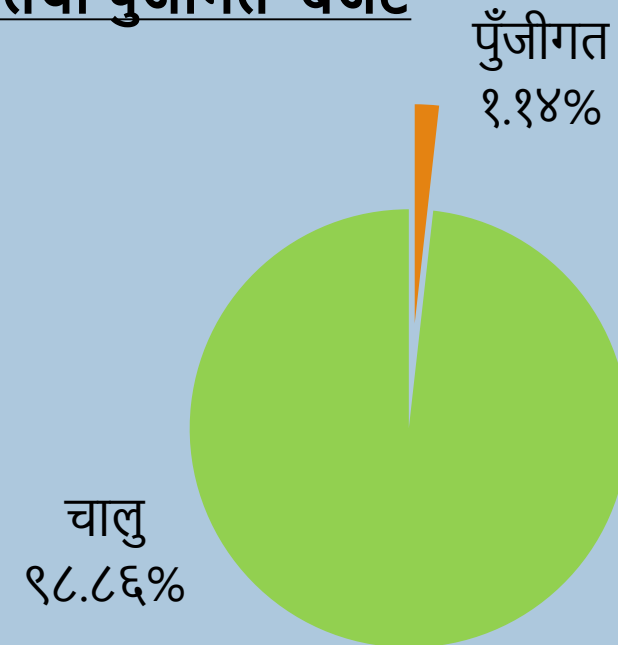

## मुख्य मुख्य कार्यक्रम (बजेट रु लाखमा )

| क्र सं | कार्यक्रम                                                                  | लक्ष्य  | बजेट   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| १      | चैते धान र बसन्ते मकैको उत्पादन प्रशोधन तथा बजारीकरण सहयोग कार्यक्रम       | ३ पटक   | १२०    |
| २      | आलुबालीको उत्पादन, बजारीकरण तथा पोष्टहार्भेष्ट सहयोग                       | २५० हे. | ३००.२५ |
| ३      | खाद्यान्नबाली वीउ उत्पादन सहयोग (उत्पादन, बजारीकरण, पोष्टहार्भेष्ट र अन्य) | ३०० हे. | २४०    |
| ४      | आलुको वीजवृद्धि सहयोग कार्यक्रम                                            | २ हे.   | १०     |
| ५      | केरा खेति सहयोग (उत्पादन/बजारीकरण) कार्यक्रम                               | ६० हे.  | १५०    |

## मुख्य मुख्य कार्यक्रम (बजेट रु लाखमा)

| क्र सं | कार्यक्रम                                                  | लक्ष्य     | बजेट |
|--------|------------------------------------------------------------|------------|------|
| ६      | तरकारीबाली उत्पादन तथा बजारीकरण सहयोग                      | १४० हे.    | ११९  |
| ७      | कृषि उत्पादन विविधिकरण (युवालक्षित उद्दमशीलता विकास) सहयोग | २० संख्या  | ९०   |
| ८      | पशुपालन व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम                       | १०० संख्या | २००  |
| ९      | पशु आहारा व्यवस्थापन तथा प्रवर्धन कार्यक्रम                | १०० संख्या | ३०   |
| १०     | पशुपालनको नश्ल सुधार सहयोग कार्यक्रम                       | ५० संख्या  | २५   |

## मुख्य मुख्य कार्यक्रम (बजेट रु लाखमा )

| क्र सं | कार्यक्रम                                                                      | लक्ष्य             | बजेट |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|
| ११     | तरकारी बेर्ना उत्पादन फार्मलाई सहयोग                                           | १० वटा             | १५   |
| १२     | व्यावसायिक कृषि उत्पादन प्रशोधन तथा बजारीकरण सम्बन्धी तालिम वस्तुगत टेवा सहित) | (३ दिने, १४ संख्या | ३५.५ |
| १३     | फलफुल बगैँचा स्थापना तथा विस्तार सहयोग कार्यक्रम                               | १० हे.             | २०   |
| १४     | शित भण्डार गृह निर्माण सहयोग                                                   | १ वटा              | ८०   |
| १५     | बीउ उत्पादक संस्थालाई वीउ भण्डारण गृह लगायतका निर्माण सहयोग                    | २ वटा              | ५०   |
| १६     | कस्टम हायरिड स्थापना तथा स्तरोन्नती सहयोग कार्यक्रम                            | १ वटा              | ५०   |
| १७     | खाद्यान्न बाली सुकाउन थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण सहयोग                             | २ वटा              | २०   |
| १८     | कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन र बजारीकरण सहयोग गर्ने कृषि औजार यन्त्र उपकरणमा सहयोग | ३०० संख्या         | ६००  |

सम्पर्क:

Email: [rjkis2ndagriculture@gmail.com](mailto:rjkis2ndagriculture@gmail.com)

Website: [www.aciu.rkip.gov.np](http://www.aciu.rkip.gov.np)

Phone: 091-561415

Facebook: Rani Jamara Kulariya



धन्यवाद
